

28. 7. 4 1800c
南スーザン派遣施設隊



南スーザン派遣施設隊 日々報告

第1632号

報告項目

1 本文（要約）

- (1) 情勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果
 - ア 活動概要
 - イ 活動成果
- (2) 明日の活動
 - ア 活動に及ぼす影響
 - (ア) 情勢
 - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
 - (ウ) 総括（評価）
 - イ 活動命令
 - (ア) 施設活動等実施に関する
行動命令
 - （方針・指導要領・各部隊の任務）
 - (イ) 視察・来隊予定
 - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

3 じ後の予定

4 情報共有事項

5 参考資料

- (1) 気象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢
- (7) 活動写真等

1 本文（要約）

1 情勢

(1) 全域

ア 和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、各地域における双方の緊張状態の継続、用地接収に関する地域住民との調整、兵站及び資金上の問題に直面するものと見積もられ、和平合意の完全な履行には混合裁判所の設立を含め時間を要するものと思料

また、28州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、政府内におけるSPLA-IO等の反対は継続するものと思料され、動向に注目

イ その他の情報資料

南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。政府関係者に対する給料未払いも継続していることから、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料

南スーダンの北部及び南部地方において、地元コミュニティの武装集団とSPLA又は暫定政府との間で抗争が生起しており、暫定政府及び28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

(2) ジュバ市外

過去の事象から突発的なSPLAと武装集団による抗争、牛を巡る抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注意が必要。また、単発的な射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要

(3) ジュバ市内

ジュバ市内、特にPOCサイトを含むUNハウス周辺では、射撃事案、経済の悪化に伴う治安事象、窃盗事案等が度々発生しており、巻き込まれに注意が必要。宿营地周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要。また、市内の緊張の高まりによるSPLA及び大統領警護隊からのハラスメントに注意が必要

(4) ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また [REDACTED] が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

(5) 活動に及ぼす影響

ア ジュバ市外においては、突発的に抗争等が生起する可能性については、否定できず。巻き込まれに注意が必要

イ 宿营地周辺における射撃による流れ弾等に注意が必要

2 本日の活動成果

(1) 方針

隊は、現地の情勢変化、UNMISSからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

(ア) #1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区におけるミフラム構築

(イ) #1 POCサイト南側外柵補修

第2施設小隊をもって、UNハウス地区におけるヘスコ補修

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区における道路補修

b メインゲートポスト移設

第1施設小隊をもって、UNハウス地区におけるゲート及びポストの移設

c アコモデーション地区交差点補修

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における交差点補修

d ウエストゲート道路拡幅

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における暗渠の設置及び道路の拡幅

e トランスポート西側排水溝整備

施設器材小隊によるUNトンピン地区における排水溝浚渫

(イ) 給水活動

給水組をもって、UNトンピン地区における給水活動（成果：5t）

(ウ) インフラ整備

な し

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 第2科をもって、経路偵察を実施し、市内の安全状況の確認
- b 情報班をもって、ジュバ市内における情報収集活動
- c 隊本部等によるUNMIS司令部から情報収集

(イ) 業務調整等

- a 隊本部等による業務調整等
- b 本部付隊による宿営地管理業務

(ウ) 宿営地内整備

な し

(エ) 教育訓練等

警備小隊等によるジュバ市内における車両操縦訓練

(オ) 民生協力

な し

(カ) 参議院議員選挙不在者投票使送者送迎

隊本部によるジュバ市内における参議院議員選挙不在者投票使送者の送迎

エ 表敬等

(ア) 隊長による日本隊宿営地におけるUNMIS戦略計画部 [REDACTED]との懇談

(イ) 参議院議員選挙不在者投票使送者（中央即応集団防衛部国際Gp長補佐）[REDACTED]来隊
(7月7日まで日本隊宿営地滞在予定)

オ 各種行事

各小隊等から選出した要員による南スーダン建国5周年記念行事サッカートーナメント

参加

カ 国際機関等連携案件

な し

3 明日の活動予定

(1) 方針

隊は、現地の情勢変化、UNMISSからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

この際、UNMISS参加国等への表敬を実施し、信頼関係の醸成を図る。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

#1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区におけるミフラム構築

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区における道路補修

b メインゲートポスト移設

第1施設小隊をもって、UNハウス地区におけるゲート及びポストの移設

c アコモデーション地区交差点補修

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における交差点補修

d ウエストゲート暗渠増設

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における暗渠の設置

(イ) 給水活動

給水組をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区における給水活動

(ウ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 第2科をもって、経路偵察を実施し、市内の安全状況の確認
- b 情報班をもって、ジュバ市内における情報収集活動
- c 隊本部等によるUNMISS司令部から情報収集

(イ) 業務調整等

- a 隊本部等による業務調整等
- b 本部付隊による宿営地管理業務

(ウ) 宿営地外整備

- 日本隊宿営地北東暗渠補修
施設器材小隊をもって、日本隊宿営地北東の暗渠補修

(エ) 宿営地内整備

- 日本隊宿営地路盤補修
施設器材小隊をもって、日本隊宿営地内の路盤補修

(オ) 教育訓練等

- 警備小隊等によるジュバ市内における車両操縦訓練

(カ) 民生協力

なし

(キ) 隊本部によるジュバ市内における参議院議員選挙不在者投票使送者の視察対応

(ク) 隊本部によるジュバ空港へのウガンダ出張者の送迎

(ケ) 隊本部によるジュバ市内における現地調達

エ 表敬等

(ア) 隊長による、UNトンピン地区におけるインド燃料小隊長表敬

(イ) 隊長による、UNトンピン地区におけるFOJ (Field Office Juba) 長表敬

オ 各種行事

なし

カ 国際機関等連携案件

なし

2 別紙（細部活動状況）

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第2 「情勢」

別紙第3 「装備品等現況」

別紙第4 「患者受診状況」

別紙第5 「人員現況」

別紙第6 「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第7 「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第8 「視察・来隊予定」

別紙第9 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

別紙第10 「全般活動予定表」

3 情報共有事項

別紙第11 「連携案件等情報」

別紙第12 「事故の概要」


1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」
別紙第2 「活動成果」

活動概要 (UNトンピン地区) (1／6)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両
①	施設	ウェストゲート道路拡幅	器材小隊	0830～1600	ウェストゲート	15	油圧×1、バケット×1、 グレーダ×1、ダンプ×1 ロードローラー×1
②	施設	トランスポート 西側側溝整備	器材小隊	0830～1600	トランスポート	10	中型×1、油圧×1 ダンプ×1
③	その他	給水	給水組	0800～1000	トランジット	2	給水車×1
④		給水	給水組	1000～1200	MSA3	2	給水車×1
⑤		南スーダン建国5周年 記念行事（サッカー）	各小隊 隊本部	0720～1200	ルワンダ宿營地	17	大型×1、ランクル×1
⑥		燃料バーコード受領	補給班	0900～1100	UNトンピン	2	小型×1
⑦		UN資材受領・払出 及び業者対応	隊本部 (S-4)	0830～1630	UNトンピン	4	
⑧		現場指導	器材小隊	0830～1600	ウェストゲート トランスポート	2	小型×1
⑨		■■■ 業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0820～1600	UNトンピン	3	高機×1
⑩		車両操縦練成	整備班	0830～1200	UNトンピン	3	小型×1
⑪		車両操縦練成	隊本部 (S-4)	0830～1630	UNトンピン	2	小型×1
⑫		ルワンダ自由の日 記念行事	隊本部 (S-1) (S-3)	1625～1900	ルワンダ宿營地	3	ランクル×1
⑬		業務調整	隊本部 (S-1)	0800～1915	UNトンピン	2	小型×1

活動概要（UNトンピン地区）（2／6）

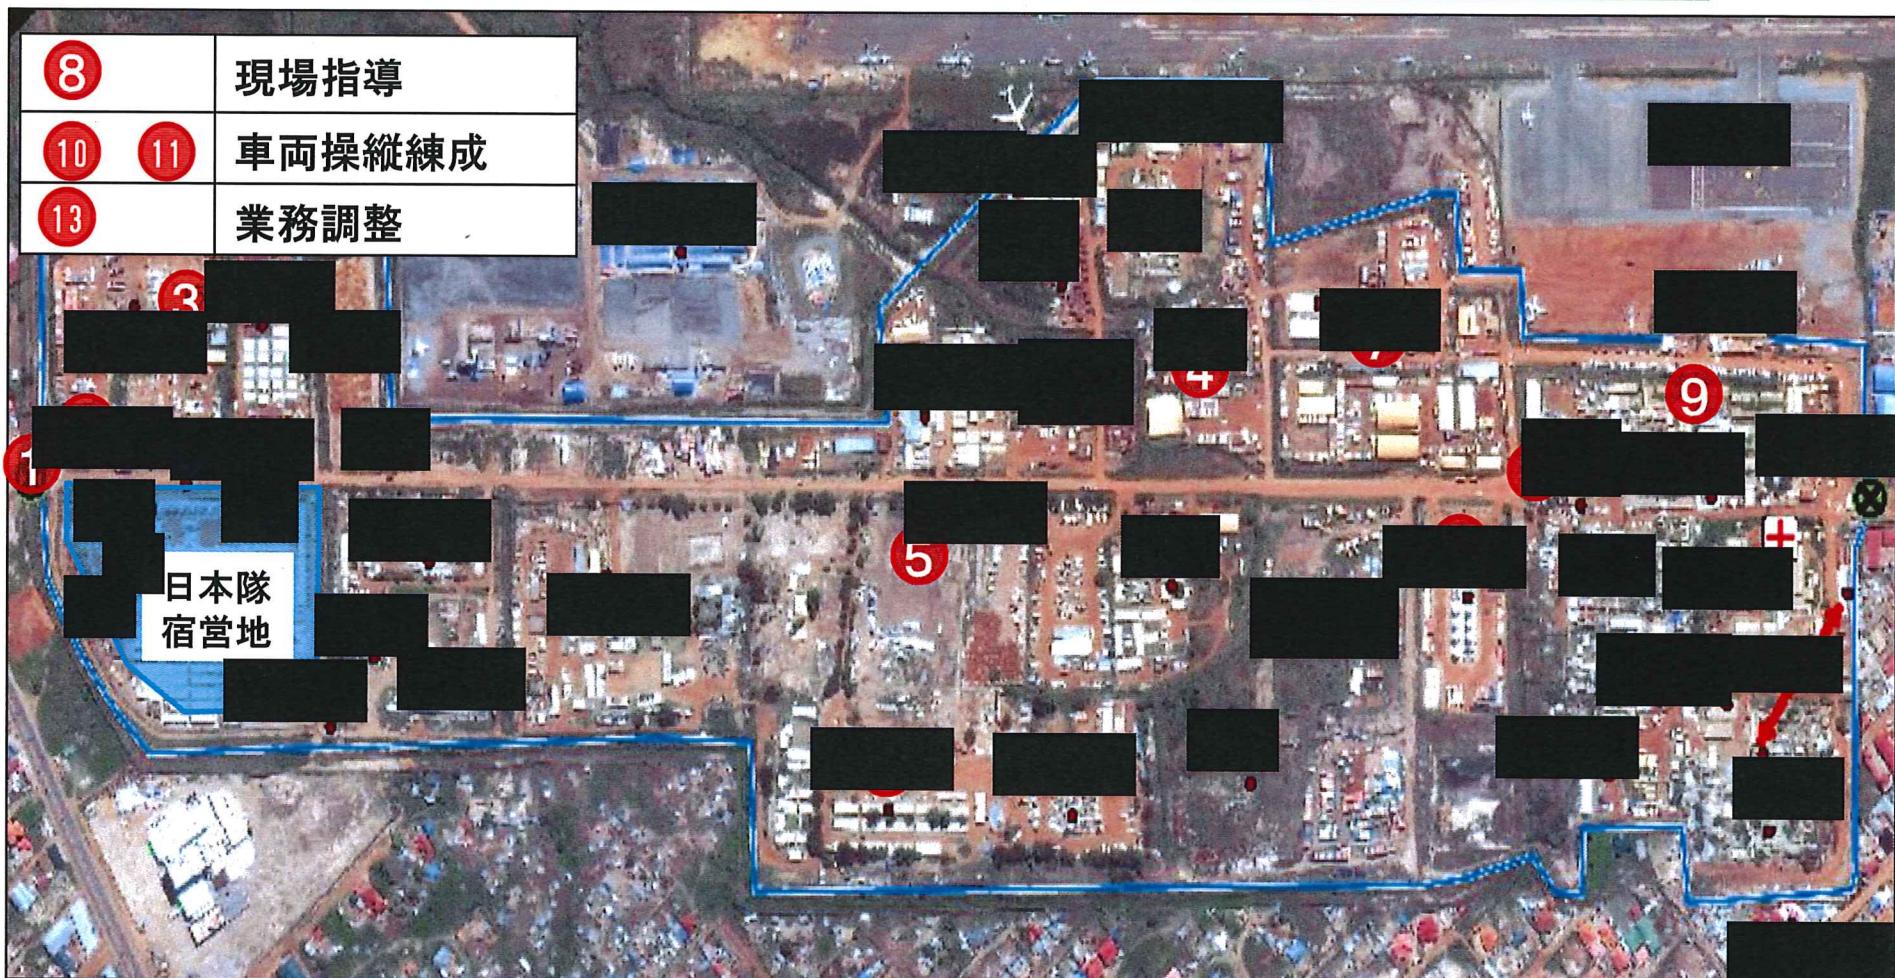

活動概要（UNハウス地区）（3／6）


番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0800～ 1630	UNハウス	17	高機×1、大型×2 道傷車×1、 小油圧×1	
②		メインゲート ポスト移設	1小隊	0800～ 1630		9	中型×1、油圧×1 中型セミトレ×1 クレーン×1 資材運搬車×1 特大型×1	
③		#1 POCサイト 南側外壁構築	2小隊	0800～ 1600		29	高機×1、小型×1 大型×3	
④		アコモデーション地区 交差点補修	3小隊	0800～ 1630		21	大型×3、小型×1 高機×1、ROV×1	
⑤	その他	現場指導	1小隊	0800～ 1630	UNハウス	5	高機×1	
⑥		現場指導	警備小隊	0830～ 1200	UNハウス及び ジュバ市内	3	LAV×1	
⑦		業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0800～ 1600		2	小型×1	
⑧		広報活動	広報班	0830～ 1700		2	小型×1	

凡例



UNタスク

活動概要（UNハウス地区）（4／6）

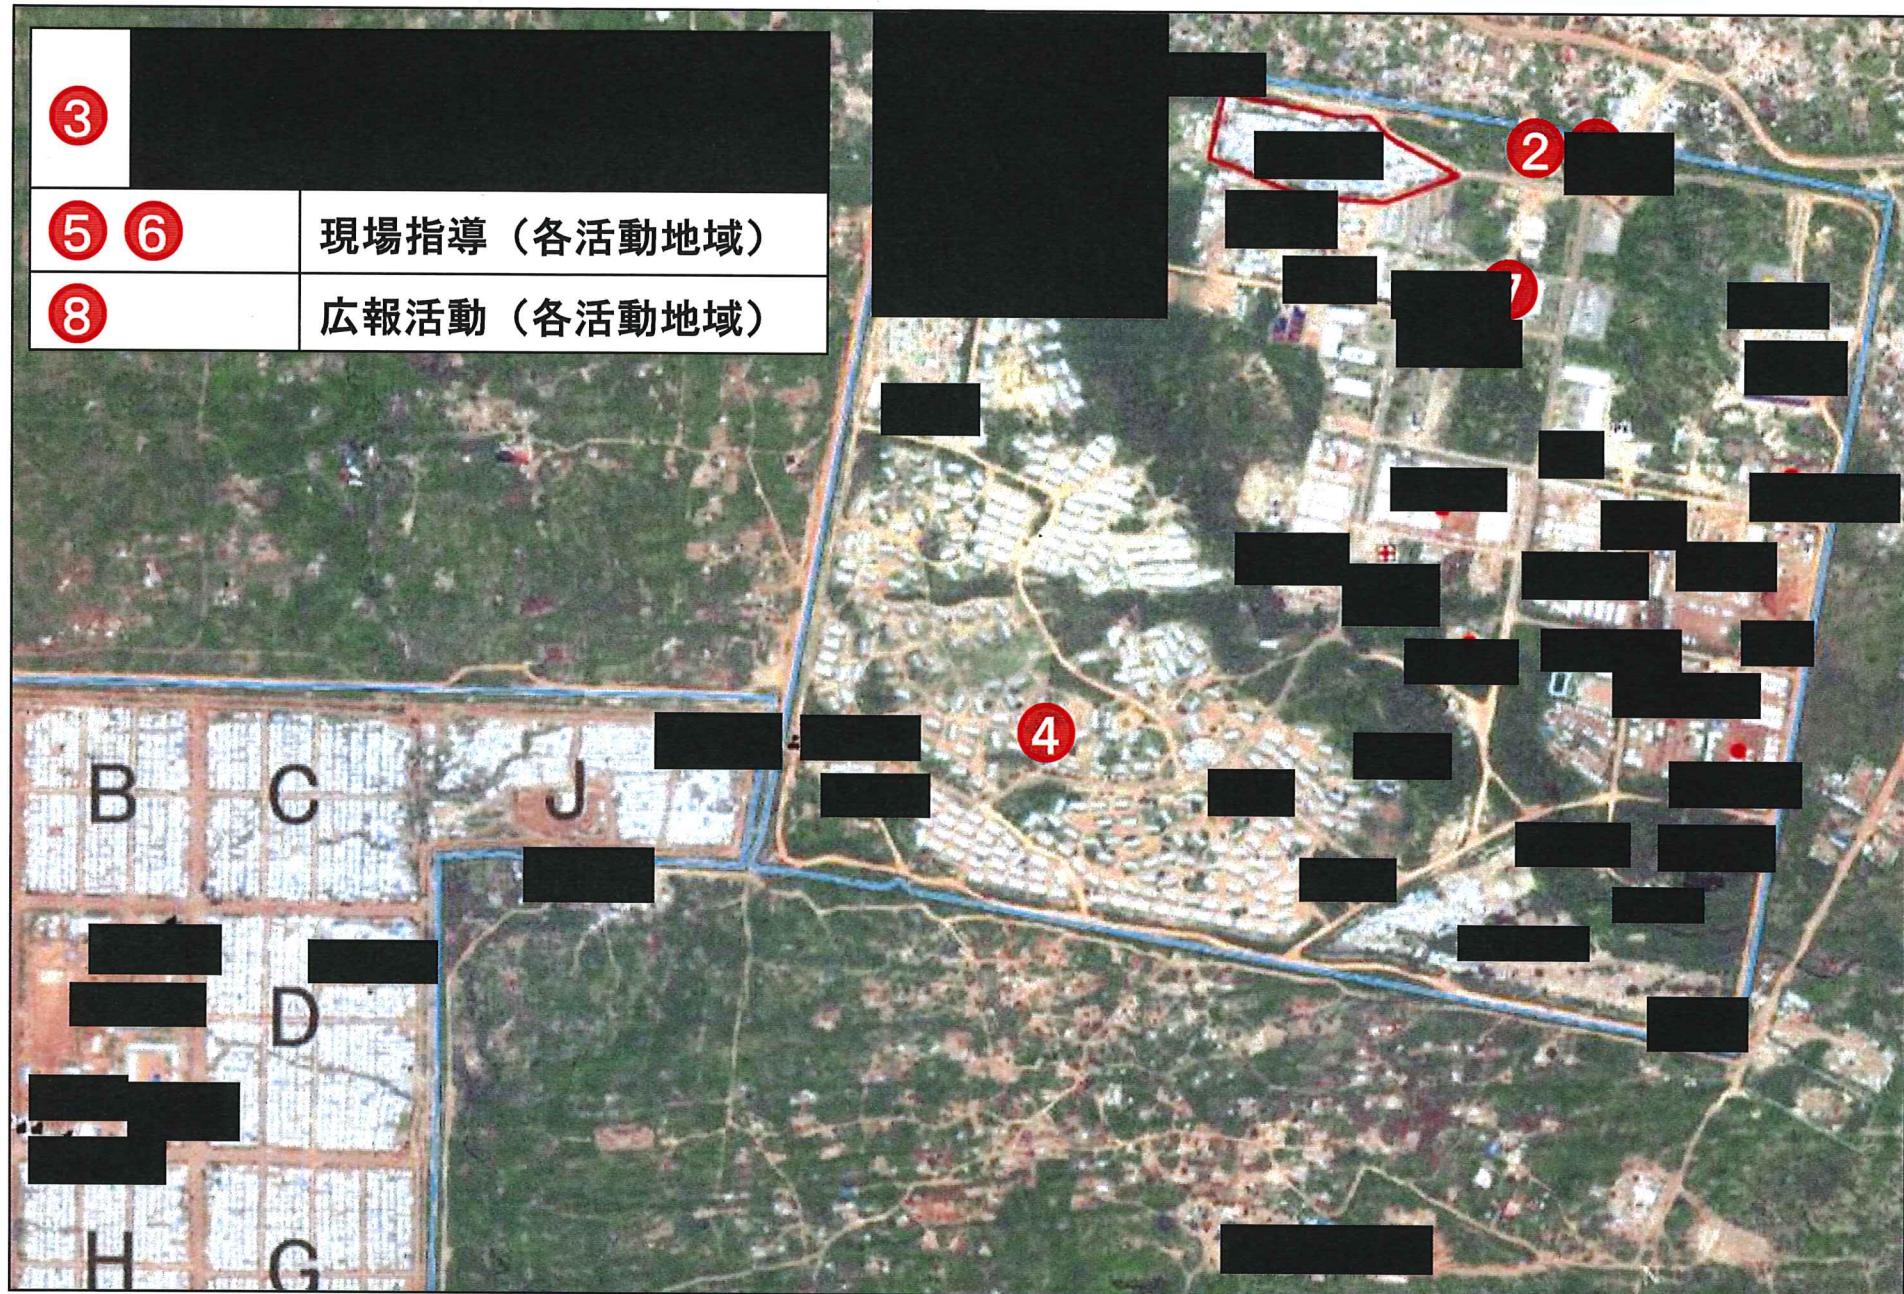


活動概要（ジュバ市内）（5／6）

別紙第1-5

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		情報収集	情報班					
③	その他	重車両輸送支援 情報収集	警務班	0700～ 1600	ジュバ市内及び UNトンピン	2	小型×1	
④		経路確認	警護班			2		
⑤		車両操縦練成	警備小隊	0830～ 1630		3	LAV×1	
⑥		参議院議員選挙不在者 投票使送者送迎	隊本部 (S-3)	0930～ 1200	ジュバ空港	2	ランクル×1	
⑦		米独立記念祝賀会	隊本部 (S-3)	1700～ 1945	米大使館	3	ランクル×1	

活動概要（ジュバ市内）（6／6）

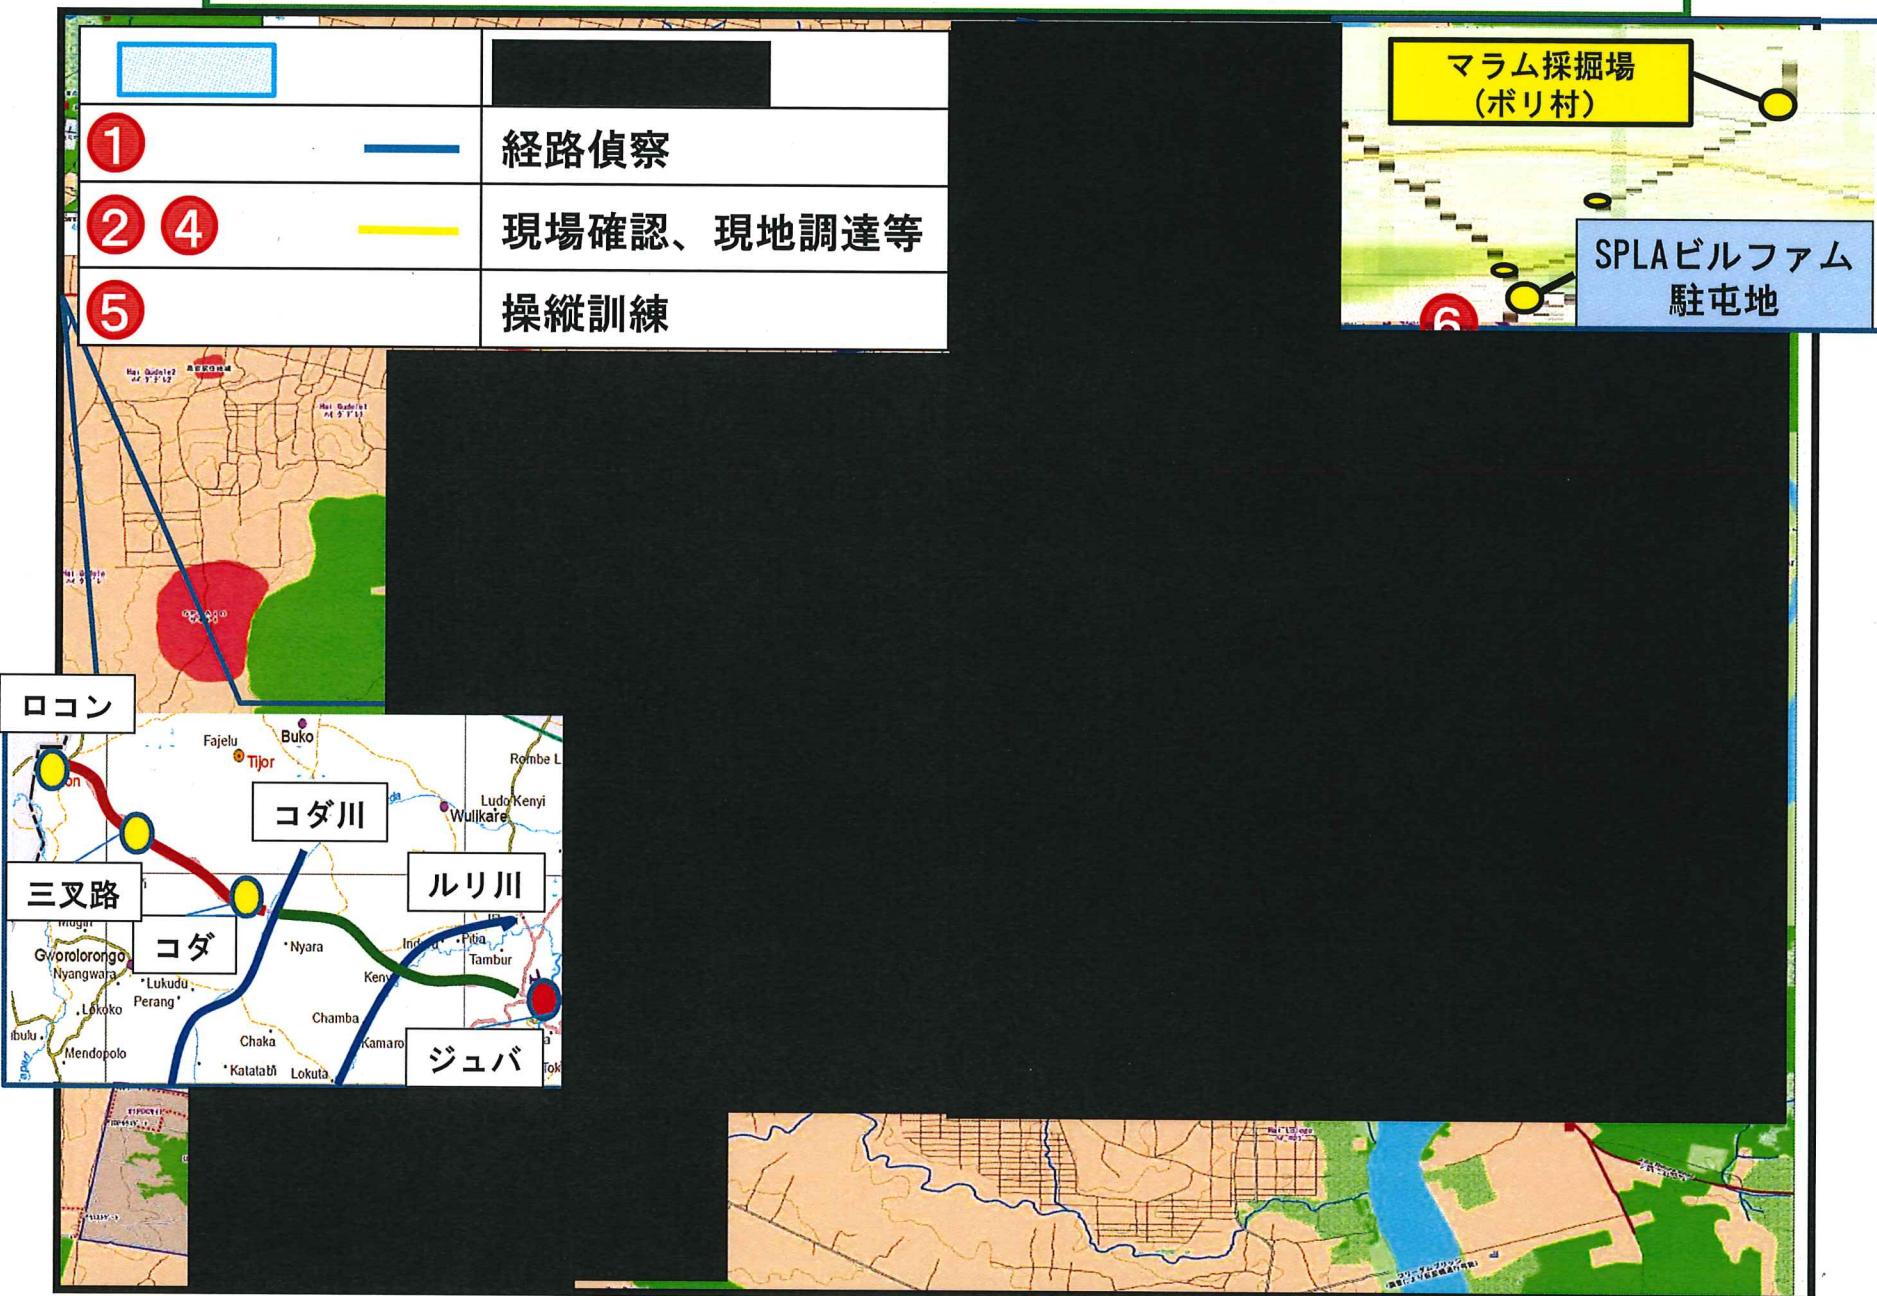

活動成果

トランスポート西側側溝整備

活動前

施設器材小隊【7.4 0900現在】



活動中

施設器材小隊【7.4 1200現在】



活動成果

進度:

累計:

- ・測溝水抜き
- ・測溝整形

活動成果

メインゲート道路補修

活動前

第1施設小隊【7.4 0930現在】



活動中

第1施設小隊【7.4 1200現在】



活動成果

進度
累計

ゲートポスト輸送

活動成果

メインゲートポスト移設

活動前

第1施設小隊【7.4 0930現在】



活動中

第1施設小隊【7.4 1200現在】



活動成果

進度
累計

ゲートポスト補修

活動成果

#1 POCサイト南側外壁構築

活動中

第2施設小隊【7.4 0930現在】



活動中

第2施設小隊【7.4 1200現在】



活動成果

進度
累計


養生
平床・整地作業

活動成果

アコモデーション地区交差点整備


活動前

第3施設小隊【7.4 0930現在】

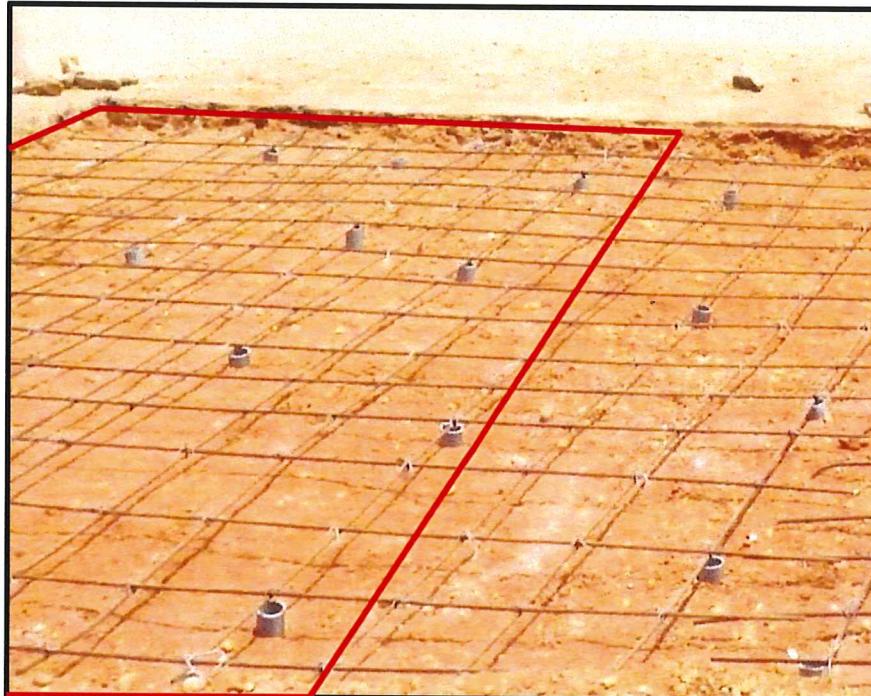

活動中

第3施設小隊【7.4 1200現在】

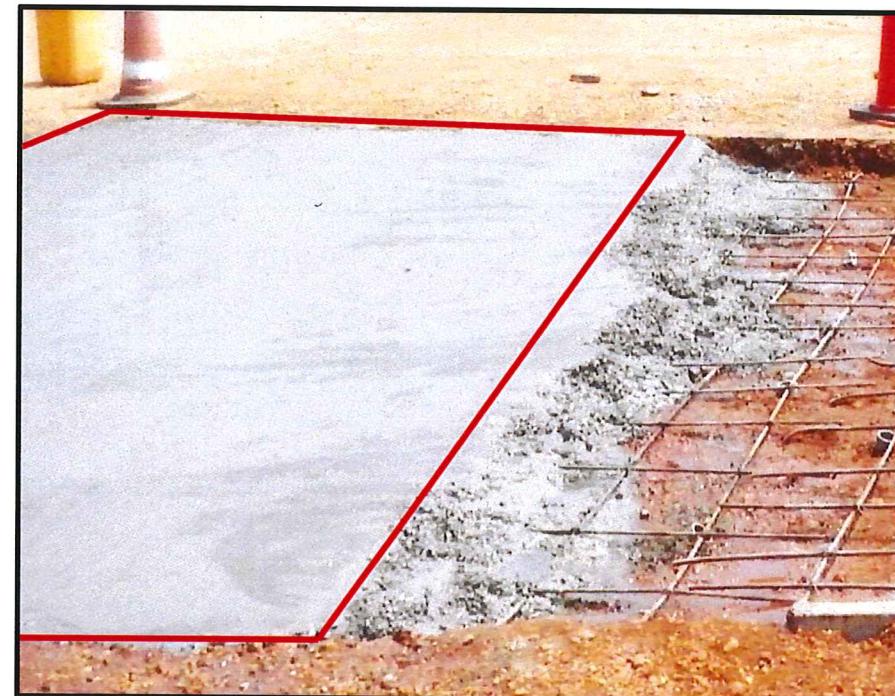

活動成果

進捗
累計

- ・コンクリート作成
- ・コンクリート整形

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第3「情勢」

別紙第4「装備品等現況」

別紙第5「患者受診状況」

別紙第6「人員現況」

別紙第7「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第8「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9「視察・来隊予定」

別紙第10「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例

青字：新規
赤字：評価

情 勢 (1 / 9) / Situation

1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

- SSNLM等のDDR（武装解除・動員解除・社会復帰：Disarmament Demobilization and Reintegration）に関連して（6月20日日報）西エクアトリア州において、800人を超す元武装勢力のユースが和平合意に従って訓練を受けており、9月中旬頃に訓練終了し、その後、警察、軍、治安関係部隊に配置される模様

（3日 Eye Radio）

→ 政府の支援を受けた和平プロセスの進展に今後も注視

(2) 和平合意不履行に関する情報

②



凡例

青字：新規
赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

③

■ 1日、キール大統領により設立された8名からなる調査機関がワウに到着、衝突の調査を開始した模様
(1日 Sudan Tribune)

■ SPLA兵士による独立記念日のセレブレーションファイアは禁止されている模様

→ 大規模なセレブレーションファイアが発生する可能性は低いものと見積もられるが、市民レベルでの散発的な発生は否定できず注意が必要

■ 南スーダン政府はEAC（東アフリカ共同体）加盟国として、同組織へ800万ドルを11月までに支払う必要があるものの、2017年度（7月1日開始）の会計予算の配分も未だ決定しておらず、予算の捻出は厳しい模様
(4日 Eye Radio)

→ 引き続き経済状態を含めて、注視。

情勢(3/9) / Situation




評価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、各地域における双方の緊張状態の継続、用地接収に関する地域住民との調整、兵站及び資金上の問題に直面するものと見積もられ、和平合意の完全な履行には混合裁判所の設立を含め時間を要するものと思料。また、28州制については各地方における大統領側で既成事実化が進んでいるが、政府内におけるIO等の反対は継続するものと思料され、地方におけるIOの動向に注目
	その他の事象	南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。一部の政府関係者に対する給料未払いも継続していることから、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料。 南スーダンの北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で抗争が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

情勢(4/9) / Situation

26

別紙第3-4

2 ジュバ市外の情勢



評価

過去の事象から突発的なSPLAと武装集団による抗争、牛を巡る抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注意が必要。また、単発的な射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要

3 ジュバ市内の情勢

- 30日、トンピン地区で強盗を捕まえようとしたSPLA兵士が撃たれて死亡
2日、ジュバ市内のNGO施設において空き巣により現金とパソコンが盗まれる被害が発生した模様
(3日 Radio Tamazuj)
→ 経済状況の悪化による犯罪が継続しているものと思料

- 2日、フリーダムホールにおいてキール氏の娘（アノク）が挙式し、マシャル氏も参加し来賓代表としてスピーチした模様
(4日 THE NATION MIRROR)
→ 両者間の一定の歩み寄りともとれるものの、引き続き両者の関係に注視

- 2日、カトール地区において、IOの情報幹部が射殺され、IO側は、政府側の治安関係者により殺害されたと発言している模様 (3日 Sudan Tribune)
→ 犯人及び動機等細部不明であるが、緊張を高める行為であり、引き続き注視




評価	ジュバ市内において経済の悪化に伴う治安事象及び窃盗事案等が度々発生しており、巻き込まれに注意が必要。また、POCサイト周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれ等に注意が必要であるとともに、市内の緊張の高まりによるSPLA及び大統領警護隊からのハラスマントに注意が必要
----	--

情勢(6/9) / Situation

ジュバ市内の状況(0630~1400)

ジュバ市内特異事象	
高官車両	なし
SPLA車両	10両
交通規制等	なし
警察等検問	なし
渋滞	1ヶ所
交通量	通常

- 凡 例
- ピク : ピックアップトラック
- テク : テクニカルトラック
- : 特異事象
- : 車両の移動等
- ✖ : 故障車等
- ✖ : 信号機故障
- : 偵察経路
- : 工事中
- : GS渋滞
- : 通行止め



1113
ピク×2
北進



1125
テク×1

1040
ピク×1
東進

凹地
通行注意

1031
ピク×1
北進

0905
ピク×1
北進

0832
ピク×2
南進

1047
ピク×1
西進


0920
GS渋滞
100m



評価	高官車両等の大規模な移動は確認できなかったが、引き続きSPLA及びSPLA-IO等の動向に注視が必要である。 また、走行時には防衛運転を確行し、特に周囲の車両の急な停車及び後退には注意を要する。
----	--

情勢(7/9) / Situation

0% 20% 40% 60% 80% 100%



- キリスト教 ■イスラム教 ■ヒンドゥ教
- 仏教 ■伝統宗教 ■ユダヤ教
- その他 ■無宗教 ■

資料源：2012.12.18 Pew Research Center





評価	イスラム教施設はジュベル川付近及びビルファム道路沿いに分布していることから、ムスリムも同地域を中心 に分布しているものと思料 また、昨年は音楽演奏や集会は確認されるものの、暴動等は確認されておらず、本年 も同様の規模又は経済状況を反映して小規模で実施されるものと思料
----	---

情勢(8/9) / Situation

30

別紙第3-8

ジュバ市内の車両運行要注意箇所

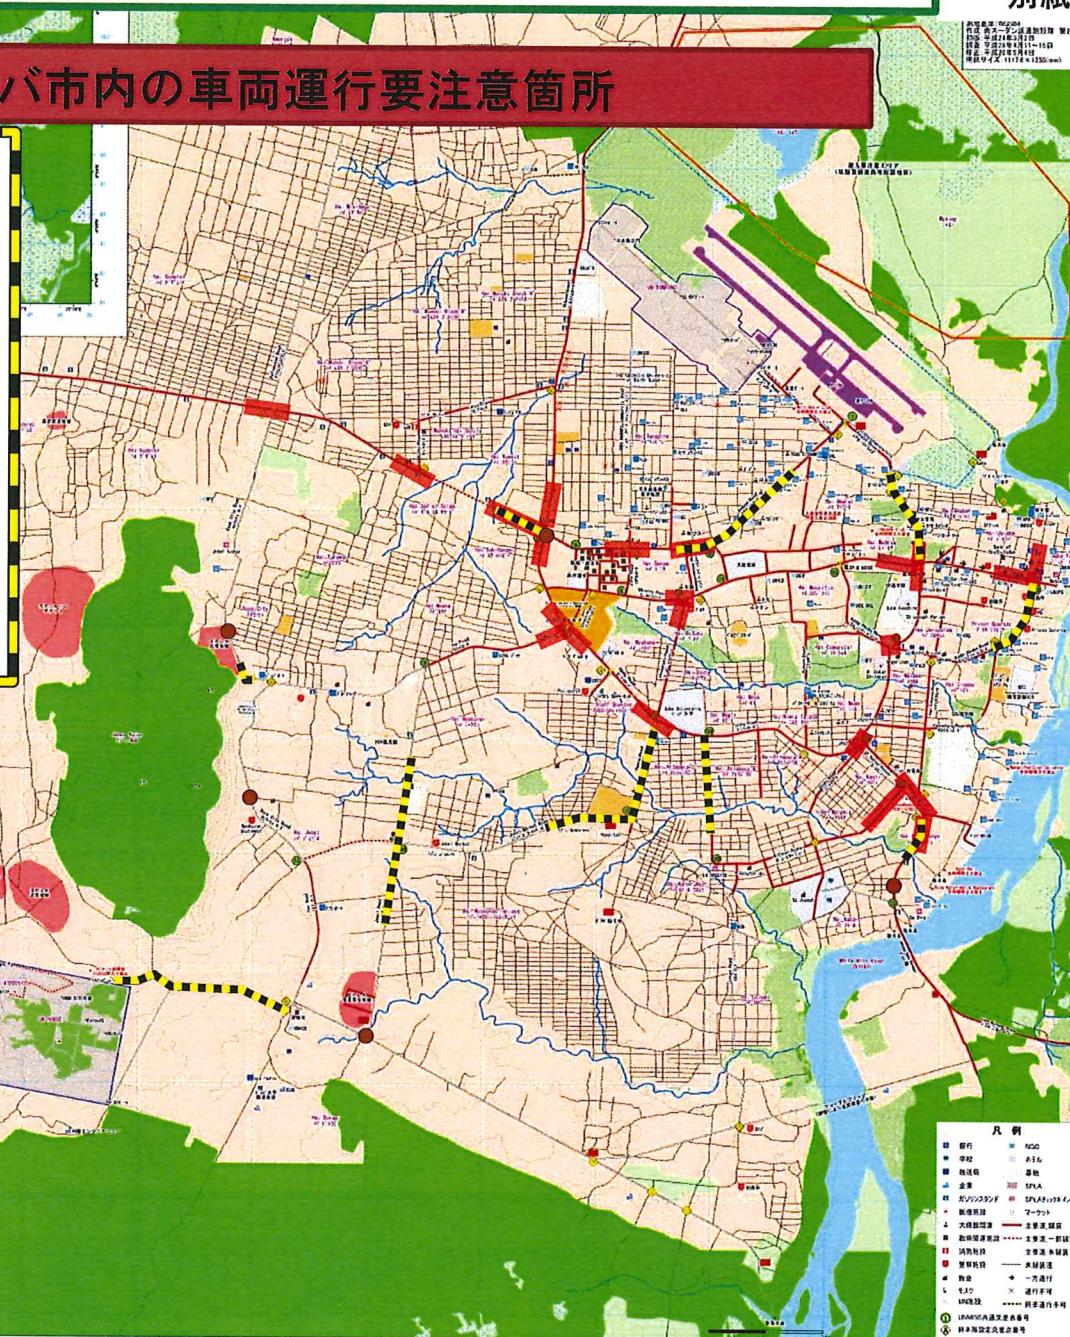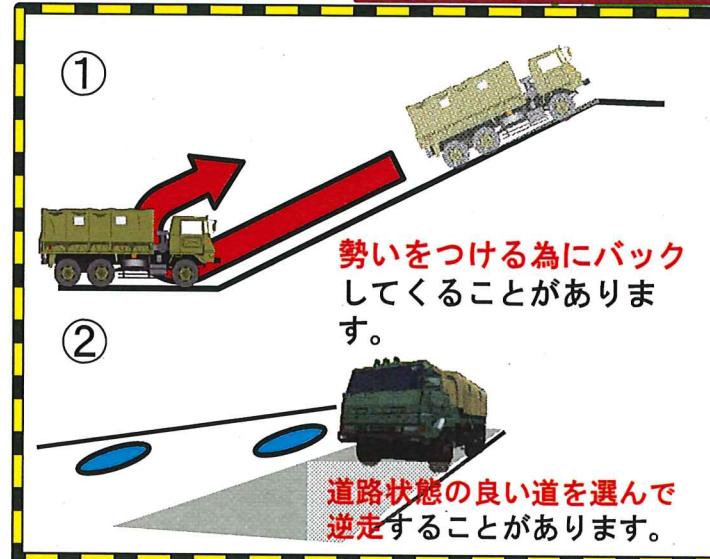

情勢(9/9) / Situation

4 気象(0600i)

地 域	天 气	気 温		湿 度		降水量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	晴れ時々曇り	24°C	46°C	23%	70%	0mm	
カンパラ	晴れ	22°C	25°C	62%	75%	0mm	

主要装備品等現況／Equipment Status

32

別紙第3-1

7月4日1600c

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	99%	高機動車のフロントカバー損傷 (自走可能)	整備見積中
施設	98%	モータグレーダの油圧バルブ作動油不足のため、不可動	(7月下旬整備完了予定)
通信	100%	なし	
需品	100%	なし	
衛生	100%	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第3-2

7月4日1600c

区分	品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	BL	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	TR	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	計				
	打ち殻	9mm打がら薬きょう			
		5.56mm打がら薬きょう			
計					

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

34

別紙第3-3


7月4日 1600c

区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考
糧食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	冷凍・耐久				
		生鮮				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
燃料	軽油(調達品)					
	軽油(UN)					
	灯油(調達品)					
	ガソリン(調達品)					
水	飲料水					
	生活用水(浄水用薬剤)					
	海水淡水化装置(浄水)					
日用品	トイレットペーパー					
	ゴミ袋					

第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.7】(10次要員)

曜 日		浄水量	消費量	貯水量 (残量)
月	27			
火	28			
水	29			
木	30			
金	1			
土	2			
日	3			



【評価】

全般的に特別な行事等がなければ、消費量 [] 未満を維持できている。

※ 貯水の危険水位 []

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が [] を超える日が [] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

【今後の見積】

雨量の減少及び器材の劣化等による急な取水量の減少が予想される。

【対策】

平日の節水による貯水量の確保

凡例 — 消費量の目安ライン

水の使用状況（先週との比較）

28. 7. 4
0800c

【H28. 6】(10次隊)

6月 第4週 (t)				
曜	日	浄水量	消費量	貯水量 (残量)
月	20			
火	21			
水	22			
木	23			
金	24			
土	25			
日	26			
計				
平均				

7月 第1週 (t)				
曜	日	浄水量	消費量	貯水量 (残量)
月	27			
火	28			
水	29			
木	30			
金	1			
土	2			
日	3			
計				
平均				

【評価】

28日に浄水装置の清掃により [REDACTED]、1日に初度巡視に向けた清掃及びタスクでの使用により、[REDACTED] ほどの日があるものの、宿營地における生活用水については、[REDACTED] 未満の低い水準を維持できている。

全体として先週に比して、消費量 [REDACTED]、平均 2 t の節水となっている。

患者受診状況

受診患者 9名

7月 3日 1800c
~ 7月 4日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
隊本部	1名		
本部付隊	5名		
第1施設小隊	1名		
第2施設小隊	1名		
警備小隊	1名		

凡例： (再) → 再 診

人員現況／Personnel Status

別紙第5

7月4日1800c

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10 次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	0	353		
CRF		1	0	1		中央即応集団 防衛部国際GP長補佐 [REDACTED] (参議院議員選挙不在者 投票使送者として 7日まで滞在)

宿營地待機人員

区 分	人員数
待機人員	[REDACTED]

総括(Assessment)

項目	事象	評価	運用への反映	
情勢	1 マンガラにおける武装グループによる襲撃(6/7, 14) 2 宿营地周辺より射撃音を確認(6/1, 14, 20, 23, 30) 3 ジュバ市街地におけるハラスマントの発生(6/13, 14, 18) 4 UNハウス周辺において、射撃事案が発生(6/5, 13, 14, 29) 5 ワウにおける武装グループによる襲撃(6/24) 6 リア郡におけるSPLAとIOの抗争(6/26) 7 市内においてパレードの練成(7/1)	○ ジュバ市外においては、突発的に抗争等が生起する可能性については否定できず、巻き込まれに注意が必要であるとともに、宿营地周辺及び市街地における射撃による流れ弾、ハラスマント等に注意が必要である。また、POCサイト周辺ではIDP同士の抗争、射撃、薬物使用者による事故等への巻き込まれに注意が必要である。	全活動を実施	
基盤上	兵站	1 グレーダコントロールバルブ付近の油圧ホース破損 2 高機動車のフロントカバー損傷	1 グレーダを必要とする作業に直接影響を受ける。 2 自走可能	現運用上支障なし
	衛生	受診患者 9名	活動に影響なし	活動に影響なし
	人事	第10次要員 353名	活動に影響なし	活動に影響なし
その他	1 UNハウスメインゲート工事中 2 UNトンピンウェストゲート工事中	1 UNハウスメインゲート 0900～1500の間、通行に制限 2 UNトンピンウェストゲート 通行制限の可能性あり	当面の間、出門の際、通行可能なゲートを使用	

明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する行動命令
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定
(CO/DCO/CSM Schedules)

7月5日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

1 情勢報告参照

2 (1) 隊は、現地の情勢変化、UNMISSからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

この際、UNMISS参加国等への表敬を実施し、信頼関係の醸成を図る。

(2) 警備レベル

3 (1) EqPt (施設器材小隊)

UNトンピンウェストゲート暗渠増設、日本隊宿营地北東暗渠補修及び路盤補修

(2) 1EPt (第1施設小隊)

UNハウスメインゲート道路補修及びポスト移設

(3) 2EPt (第2施設小隊)

#1POCサイト南側外壁構築

(4) 3EPt (第3施設小隊)

アコモデーション地区交差点補修

(5) S e c P t (警備小隊)

宿营地警備、[REDACTED] 及び車両操縦練成

(6) HQ u (本部付隊)

給水活動、宿营地維持・管理活動、[REDACTED] 及び車両操縦練成

(7) M I S e c (情報班)

ジュバ市内における情報収集

(8) M P S e c (警務班)

重車両輸送支援及び [REDACTED]


(9) G u a r d S e c (警護班)

隊長警護及び経路確認

活動概要（UNトンピン地区）（1／6）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両
①	施設	ウエストゲート 暗渠増設	器材小隊	0830～ 1600	ウエストゲート	11	油圧×1、ダンプ×2
②	その他	給水	給水組	0800～ 1000	トランジット	2	給水車×1
③	施設	日本隊宿營地 北東暗渠補修	器材小隊	0830～ 1600	宿營地北東	7	油圧×1、ローラ×1
④		日本隊宿營地 路盤補修	器材小隊	0830～ 1600	宿營地 多目的広場	2	バケット×1
⑤	その他	給水	給水組	1000～ 1200	ネパール隊	2	給水車×1
⑥		UN資材受領・払出 及び業者対応	隊本部 (S-4)	0830～ 1630	UNトンピン	2	なし
⑦		ドライバーズ パーミット業務	隊本部 (S-4)	0800～ 1200	UNトンピン	2	中型×1
⑧		現場指導	器材小隊	0830～ 1600	ウエストゲート トランスポート	3	小型×1
⑨		車両操縦練成	隊本部 (S-4)	1300～ 1630	UNトンピン	3	小型×1
⑩		インド燃料小隊長表敬 フィールドオフィス ジュバ長表敬	隊本部 (S-1) (S-3)	1300～ 1350	インド燃料小隊 宿營地	4	ランクル×1
⑪		週工兵会議 業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0800～ 1200	UNトンピン	5	高機×1


凡例



UNタスク

活動概要（UNトンピン地区）（2／6）

別紙第7-4

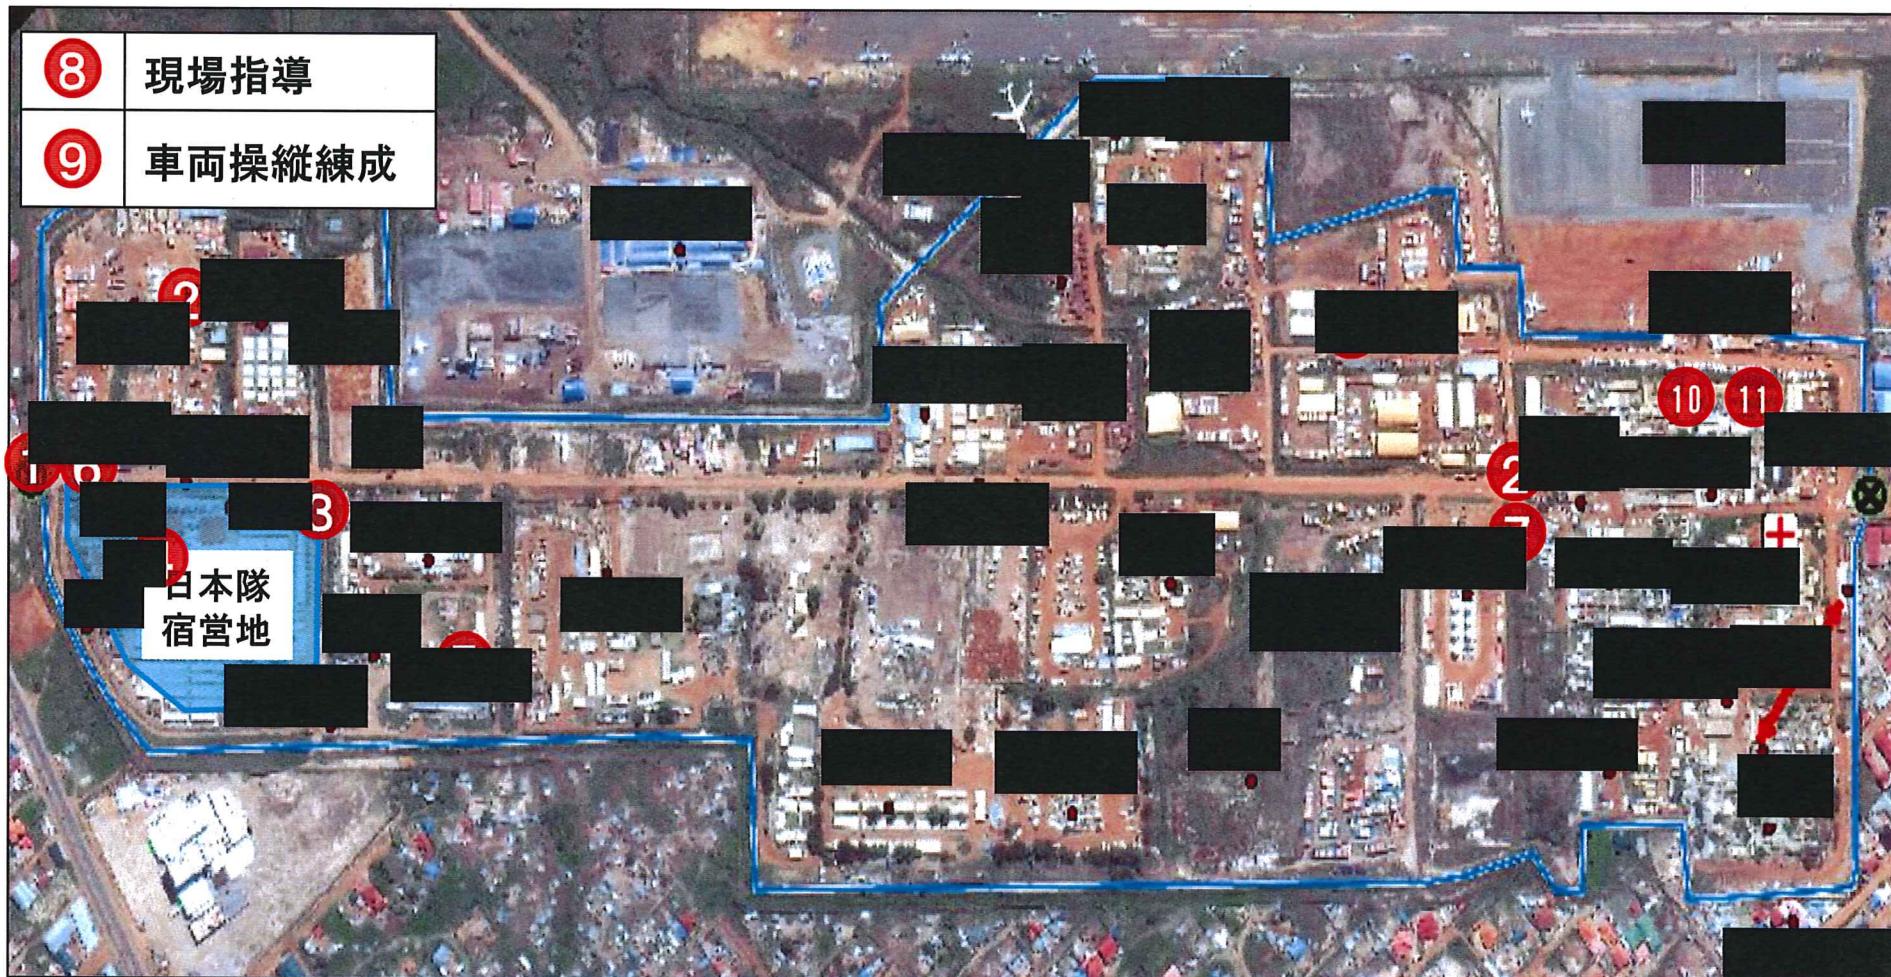

活動概要（UNハウス地区）（3／6）


番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1 小隊	0800～ 1630	UNハウス	17	高機×1、大型×2 道傷車×1、 小油圧×1	
②		メインゲート ポスト移設	1 小隊	0800～ 1630		8	中型×1、油圧×1 特大型×1 クレーン×1 資材運搬車×1	
③		#1 POCサイト 南側外壁構築	2 小隊	0800～ 1600		29	高機×1、小型×1 大型×3、 ユニック×1	
④		アコモデーション地区 交差点補修	3 小隊	0800～ 1630		21	大型×2、小型×1 高機×1、ROV×1 散水車×1	
⑤	その他		警護班 隊本部 (S-1)		UNハウス及び ジュバ市内			
⑥		給 水	補給班	0800～ 1200		7	給水車×1 小型×2	
⑦		現場指導	1 小隊	0800～ 1630		5	高機×1	
⑧		現場指導	警備小隊	0830～ 1600		3	LAV×1	
⑨		業務調整（涉外）	隊本部 (S-1)	0900～ 1600		2	小型×1	
⑩		業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0800～ 1600		2	小型×1	
⑪		広報活動	広報班	0830～ 1700		3	小型×1	

凡例



UNタスク

活動概要（UNハウス）（4／6）


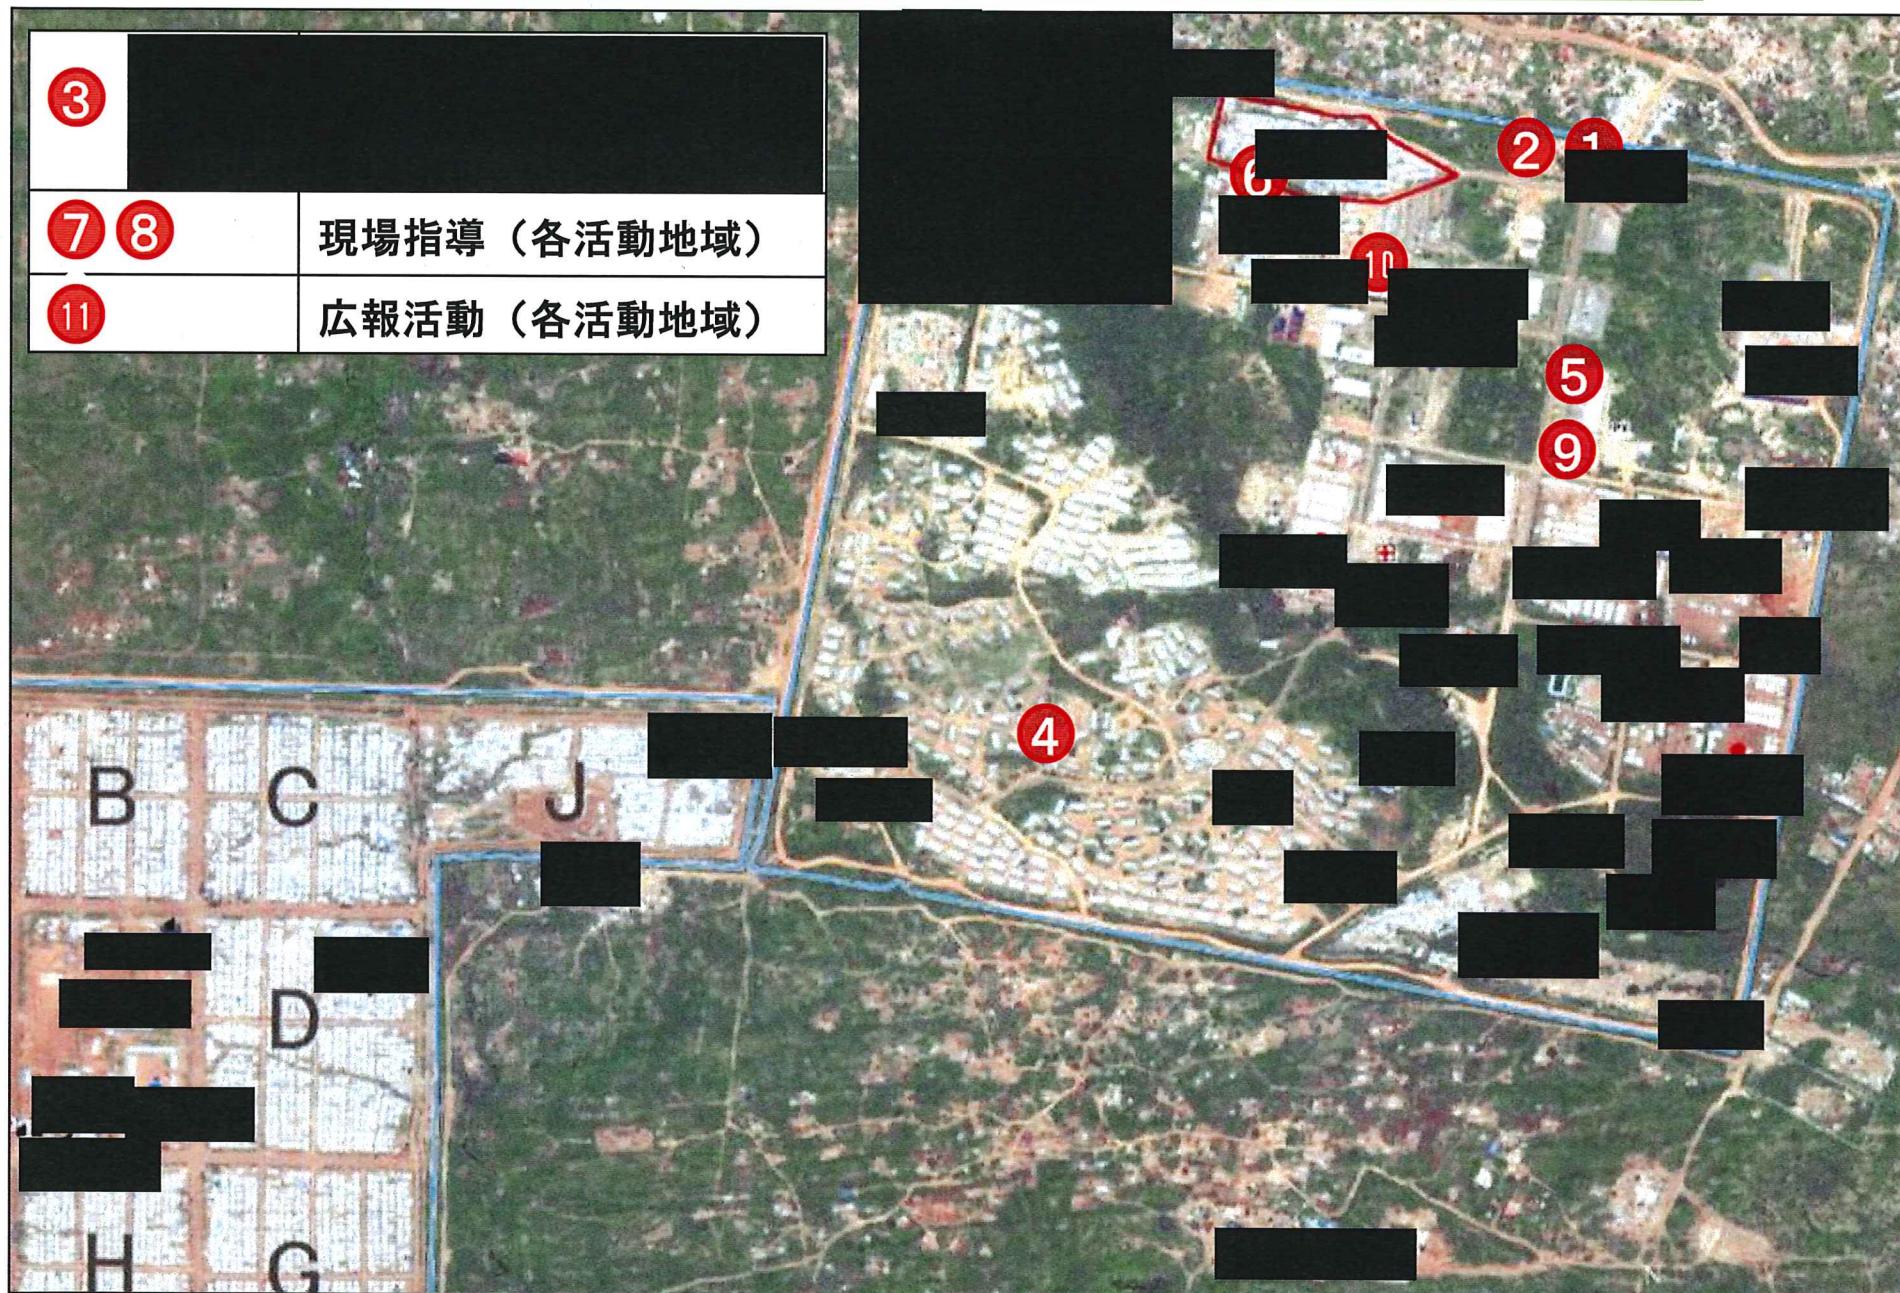


活動概要（ジュバ市内）（5／6）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		情報収集	情報班					
③	その他	重車両輸送支援 情報収集	警務班	0700～ 1600	ジュバ市内及び UNトンピン	2	小型×1	
④		経路確認	警護班					
⑤		経路確認	隊本部 (S-3)	1000～ 1600	UNハウス	5	ランクル	
⑥		車両操縦練成	警備小隊	0830～ 1600		3	LAV×1	
⑦		車両操縦練成	衛生班	0900～ 1100		3	AMB×1	
⑧		現地調達（売店）	隊本部 (S-4)	1330～ 1630	ジュバ市内	3	高機×1	
⑨		市場調査及び現地調達 (会計)	隊本部 (S-4)	0830～ 1200		3	高機×1	
⑩		空港端末地業務 (ウガンダ出張者送迎)	隊本部 (S-4)	0830～ 1300		5	小型×2	

活動概要（ジュバ市内）（6／6）

①	経路偵察
② ④ ⑤ ⑧ ⑨	現場確認、現地調達等
⑥ ⑦	操縦訓練

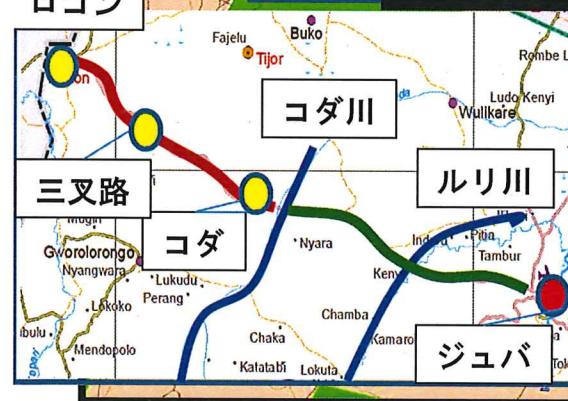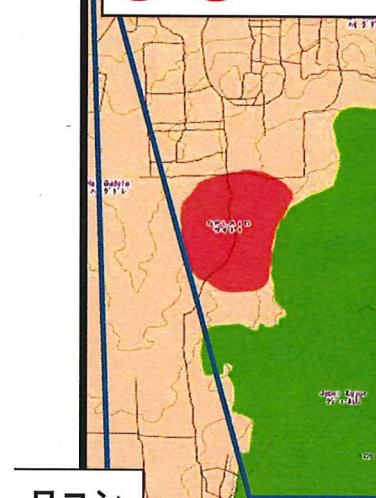

視察・来隊等予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
7月7日 1430まで	○ 中央即応集団防衛部国際GP長補佐 [REDACTED]	参議院議員 選挙不在者 投票使送者 として来隊

隊長、副隊長の行動予定 (CO/ DCO Schedule)

別紙第9-1

	AM	PM	課業外
隊長			
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定 (CSM Schedule)

51

別紙第9-2

	AM	PM	課業外
最先任 上級 曹長			

3 じ後の予定

別紙第10「全般活動予定表」

7月間業務予定

別紙第10-1

月	7月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
全般	定期昇任	隊朝礼	参議院選挙不在者投票	ウガンダ出張	モンゴル歩兵大隊ナショナルディ	警備訓練	隊朝礼	状況報告(CRF司令官)	給水活動	状況報告(FC-COS)	ウガンダ出張	日米豪勉強会	毎月点検	月例点検																	
初度巡視	トランボート西側排水構整備	トランボート西側排水構整備	衛星アンテナ外柵構築																												
UN トンピン	UN ハウス	UN 施設外	#1POCサイト南側外壁構築、メインゲート道路補修	ボリ村マラム採取場道路整備	ボリ村マラム積載・運搬	MSR整備																									
教育訓練	消防訓練	部隊交代計画要領(大綱)	第2回#11次要員等受入れPJ会議	第11次要員の編成に関する意見について	第11次要員等受入要領の検討																										
連絡調整	第1回#11次要員等受入れPJ会議	ODA-PKO TF担当者会議	ODA-PKO TF担当者会議	ODA-PKO TF担当者会議																											
情報・保全	月例点検																														
人事・総務・厚生	昇任申告	隊朝礼	孤児院慰問	孤児院慰問	ルワンダ航空隊メダルパレード	隊朝礼	孤児院慰問																								
初度巡視	参議院選挙不在者投票	ネバール歩兵大隊メダルパレード	隊朝礼	ルワンダ航空隊メダルパレード	隊朝礼	孤児院慰問																									
広報	南スーダン独立5周年行事	広報担当者会同	追送品受入	家庭通信2号発刊																											
後方・会計・輸送	調達担当者会同	ウガンダ出張(会計)	ウガンダ出張(後方運用)	法務便り	現況調査	毎月点検																									
警務・法務	衛生教育(メファキン内服)	衛生教育(メファキン内服)	衛生教育(メファキン内服)	現況調査	現況調査																										
衛生・医務	衛生教育(メファキン内服)	衛生教育(メファキン内服)	衛生教育(メファキン内服)	現況調査	現況調査																										
その他 (表敬等)	情報本部分析課長来隊対応																														

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間活動予定（7／3～7／9）第30週

54

別紙第10-2

日曜日	7/3 日	7/4 月	7/5 火	7/6 水	7/7 木	7/8 金	7/9 土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

青字：隊長関連

週間活動予定（7／10～7／16）第31週

別紙第10-4

日	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

4 情報共有事項

別紙第11「連携案件等情報」

別紙第12「事故の概要」

連携案件等情報

1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	● #1担当会同(6/21)を実施し、情報を収集完了 ● 7月7日1400よりMTC・JICAとの#2会同	MTC JICA	● MTC側で隊の能力と先方ニーズとの合致状況の確認中 ● じ後、訓練対象・時期等を検討し、大綱仰指予定	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	8月下旬～9月上旬予定 情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4		リオ五輪南ス選手壮行会における文化紹介支援	JICA	時期・内容(実施の有無含む) 未定	JICA	情報収集中	
5	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	● 工兵課からタスク発出済み	UNOPS (大使館)	● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿営地に持ち込み(1日程度)	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan : 包括的農業マスタートップラン

※赤字 : 変化事項

※2 UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関

凡 例 ◎： タスク化成立 ○： 自隊による実施 ×： 実行の可能性低 一： 調整中


2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

事故の概要

別紙第12-1

項目	内 容		要図等
発生日時	平成28年7月4日(月) 0808		
発生場所	ロックシティロード上(交点Nから北へ約300m)		
編成・装備	1 活動部隊：隊本部 (1) 人員：[REDACTED] (隊本部×2、[REDACTED]) (2) 車両：高機×1、[REDACTED] 2 [REDACTED] (1) 人員 (2) 小型トフック×2		 <p>SP 兵舎地 Rock City ロックシティ Jubat N</p>
状況	1 前方を走行中の民間トラックが凹地において急遽後退し、停車していた高機動車に接触したもの 2 負傷者：彼我ともになし 3 民間トラック：損傷なし 4 高機動車：左ボンネット破損、保安部品異常なし 5 付紙「事故現場要図」		凡例 ● : 事故現場
概要	0808 接触事故発生(ロックシティロード上(交点Nから北へ約300mの位置)) 0813 現場より第1報(民間トラックが後退し高機動車に接触) 0825 [REDACTED] 0848 [REDACTED] 0909 警務及びUNMPが現地到着 0923 UNMPによる現場検証を実施し、アクシデントリポートを記入 0945 現場検証終了 1036 宿营地到着 1039状況報告 1456 Dr、車長、警務及び通訳、UNトンピン内でのUNMPによる事情聴取に前進 1549 UNMPでの事情聴取を終え帰隊、異状なし		

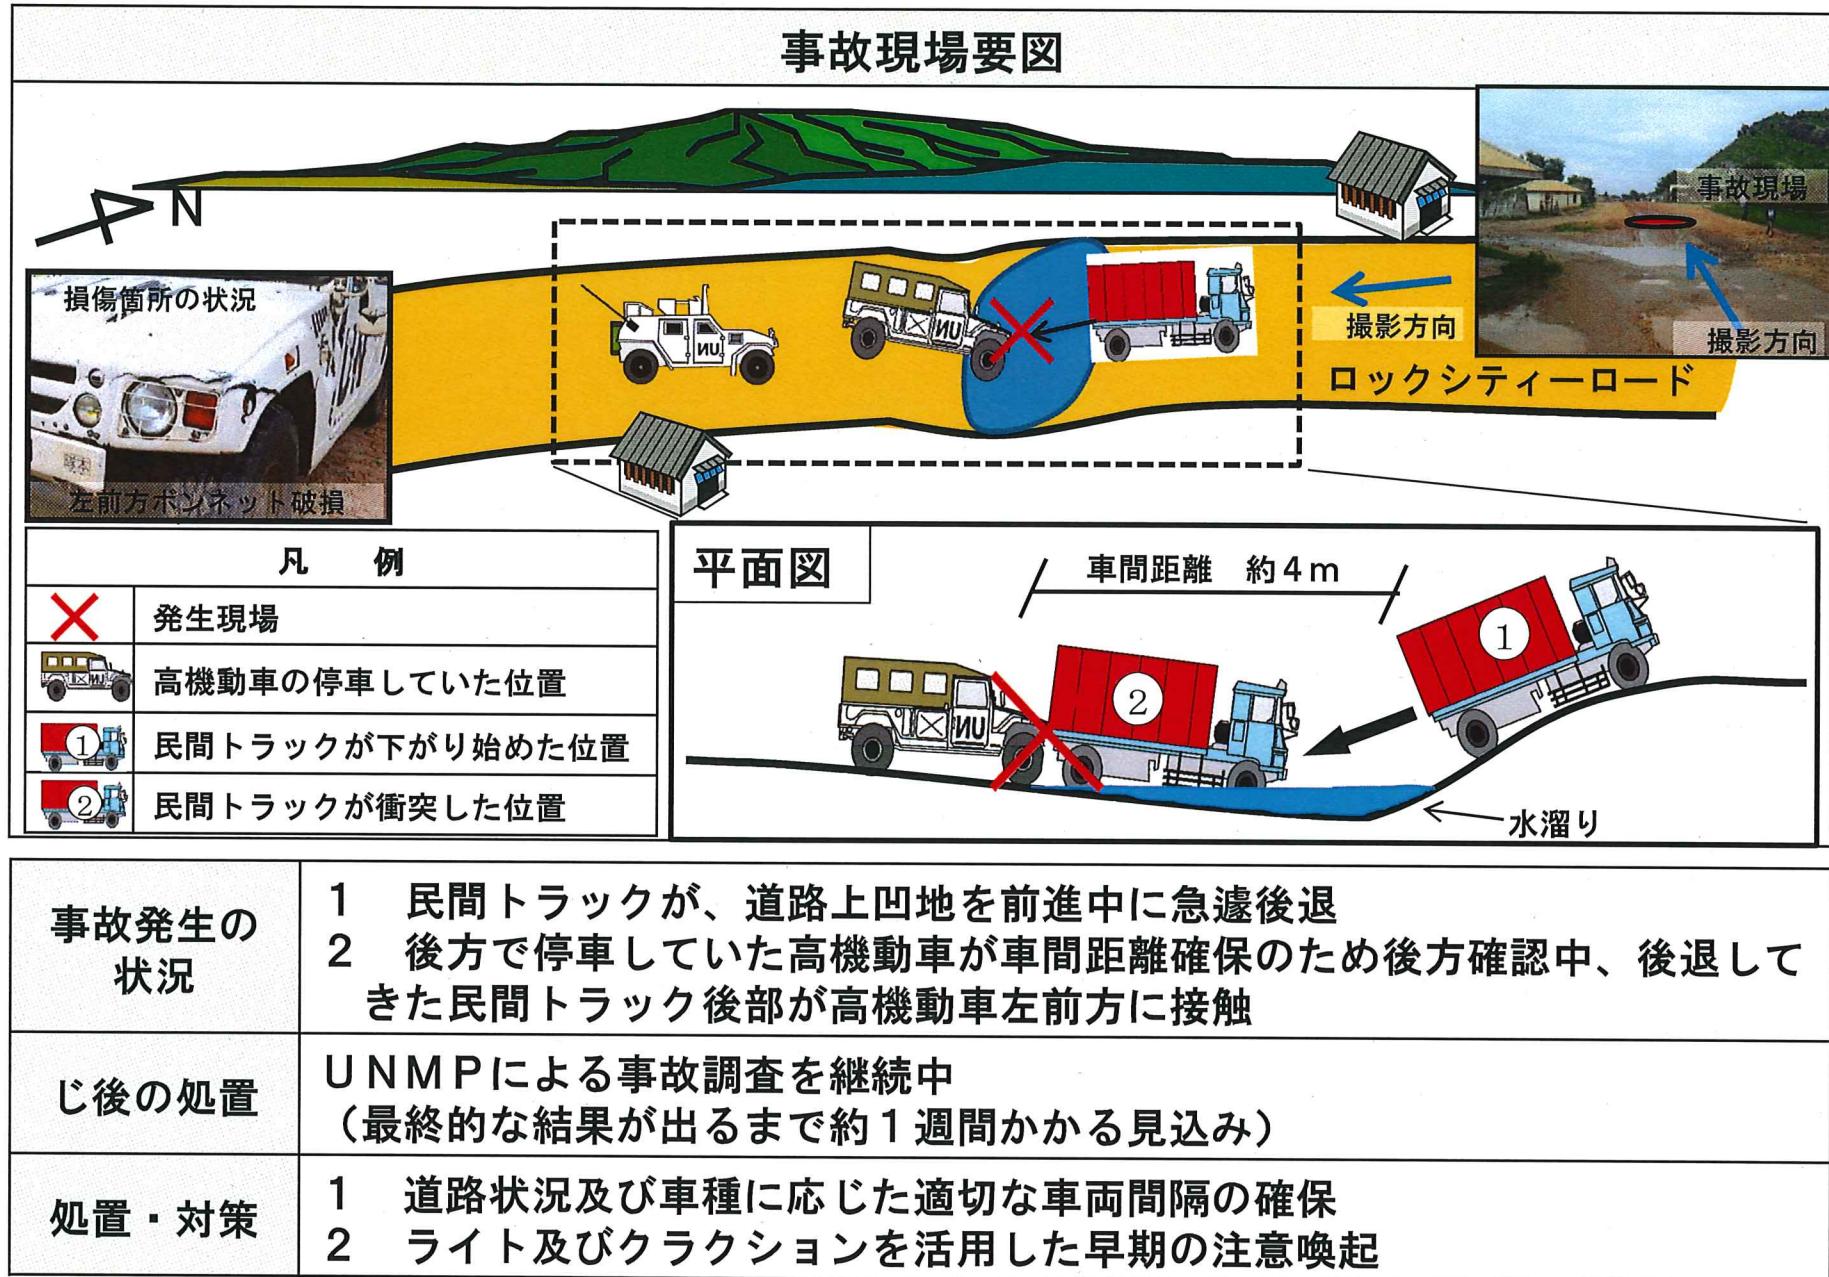


5 參考資料

気象(4~5日) ジュバ/Weather JUBA

最高気温(1400
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
46°C	38°C	40%	0mm

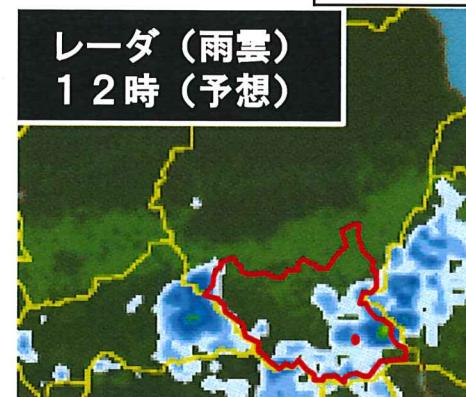

日(曜) Date		4日(月)				5日(火)			
時 Hrs		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動									
Juba	天 气								
	気温(°C)	25	24	23	23	24	28	28	27
	降水確率	60%	50%	20%	10%	20%	20%	20%	20%
	雨量	1mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
	風向	北北西	南南西	南南西	南	南	南	南	西南西
	風速	1	1	1	1	2	2	2	1
評価 Assessment	施設活動								
	行 事								

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

気象(週間) ジュバ／Weekly Weather JUBA

日(曜)	6日(水)	7日(木)	8日(金)	9日(土)	10日(日)
主要な活動		サッカー 兜2佐帰国			
	会計ウガンダ出張			UNの基盤整備	
Juba	天 气				
	気温(°C)	29/22	29/21	31/21	29/21
	降水確率	40%	60%	60%	80%
	雨量	1 mm	5 mm	2 mm	4 mm
	評価				
Kampala	天 气				
	気温(°C)	26/19	26/18	27/19	25/22
	降水確率	0%	10%	0%	10%
	雨量	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

評 価 Assessment	1 ジュバについては、週を通して降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性
	2 ウガンダは、天候が安定しているが、突然の雷雨等には注意が必要

暫定政府樹立までの主要結節 / Major events until TGoNU establishment

63

区分	9月	10月	11月	12月	1月	
全般	8.26			26 27	22	12 22
軍 和平合意署名	停 戰	27 兵力引き離し		移動申告		
	外 国 軍 撤 退		12 撤退完了 20 30 移動開始 撤退完了			
	ジ ュ バ 非 武 装 化	27 24. 開始 移転先選定中		23. 終了 一部移転 (2cBn 250名)		
	即 時 開 始		26 部隊勢力 配分決定		→IO不参加	
	国 会 議 会 の 拡 大			26 定数拡大完了		
	権 力 配 分		23 追加議員 配分		JMEC会議	JMEC会議
	選 挙				5 追加議員 提出	延期
	憲 法 修 正	即時 憲法委員会組織 18 修正案起草	7ヶ月以内 選挙委員会再構成 修正案採択	6 大統領署名 修正委員 議長指名	23 ポスト 配分会議	7 ポスト 配分決定

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

64

区分	2月	3月	4月	5月	6月	7月	評価
全般	2 9 23	9 16 24	21 25 26 29 29 29	31	23		
軍 事	停戦						
	外国軍撤退						
	ジュバ非武装化	CTSAMM会議	CTSAMM会議	IOCの一 部ジュバ帰還(24. 28.29.31)	IOCの一 部ジュバ帰還(1. 10.21)	マシヤル氏ジュバ帰還	州境委員会会議(28州問題)
	統合	JMEC会議	JMEC会議	JMEC会議	JMEC会議	第1回暫定政府樹立	国家立法議会の拡大及び任命
	国会議会の拡大					議会運営開始	
	権力配分				大臣指名	運営開始	
政府樹立	選挙			選挙委員会構成	27		8.0
	憲法修正		憲法修 案提出	案採択	大統領署名	憲法発布	選挙実施


CTSAMM:暫定治安措置監視メカニズム

凡例 赤字:変化事項

2015.8

▼ 2016.7

2018 →

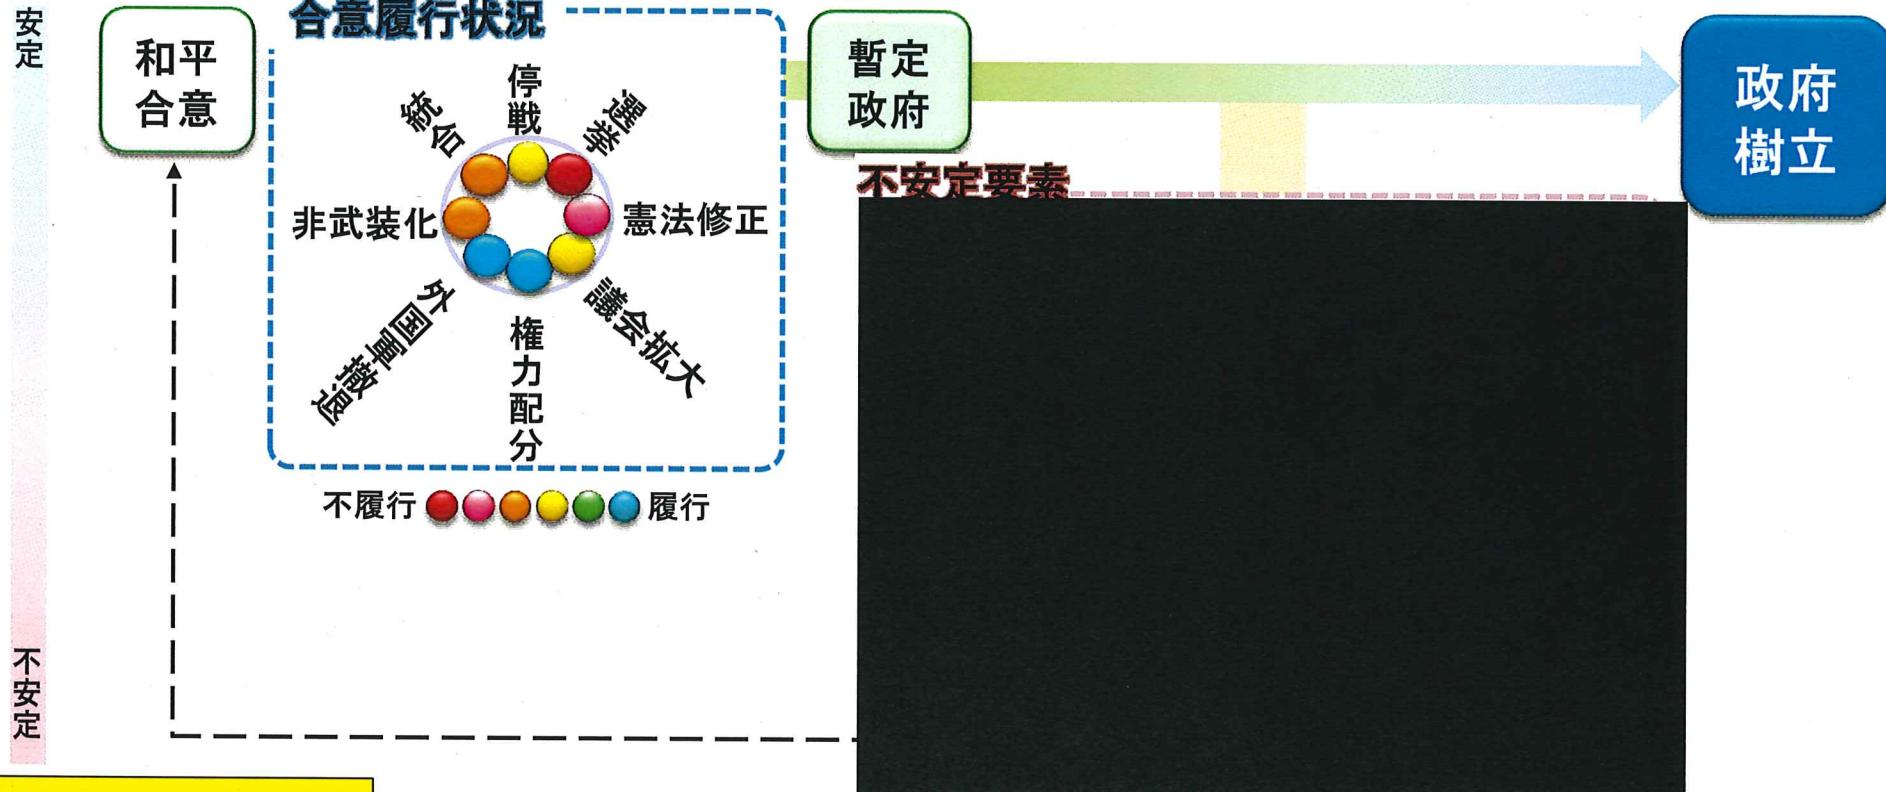

我に及ぼす影響


関係悪化モデル

- ジュバの内戦状態に伴う **UN活動の停止**
- 武力衝突・**活動の制限**に伴う、**活動の制限**
- ジュバ市内への大量の IDP の流入
- チェックポイント警戒強化(我の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止

和平成立モデル

- 治安改善に伴う **UNマンデートの変更**
- 少数派による **新体制批判デモ**
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- S P L A と地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

部隊配置状況（2016年7月4日現在）

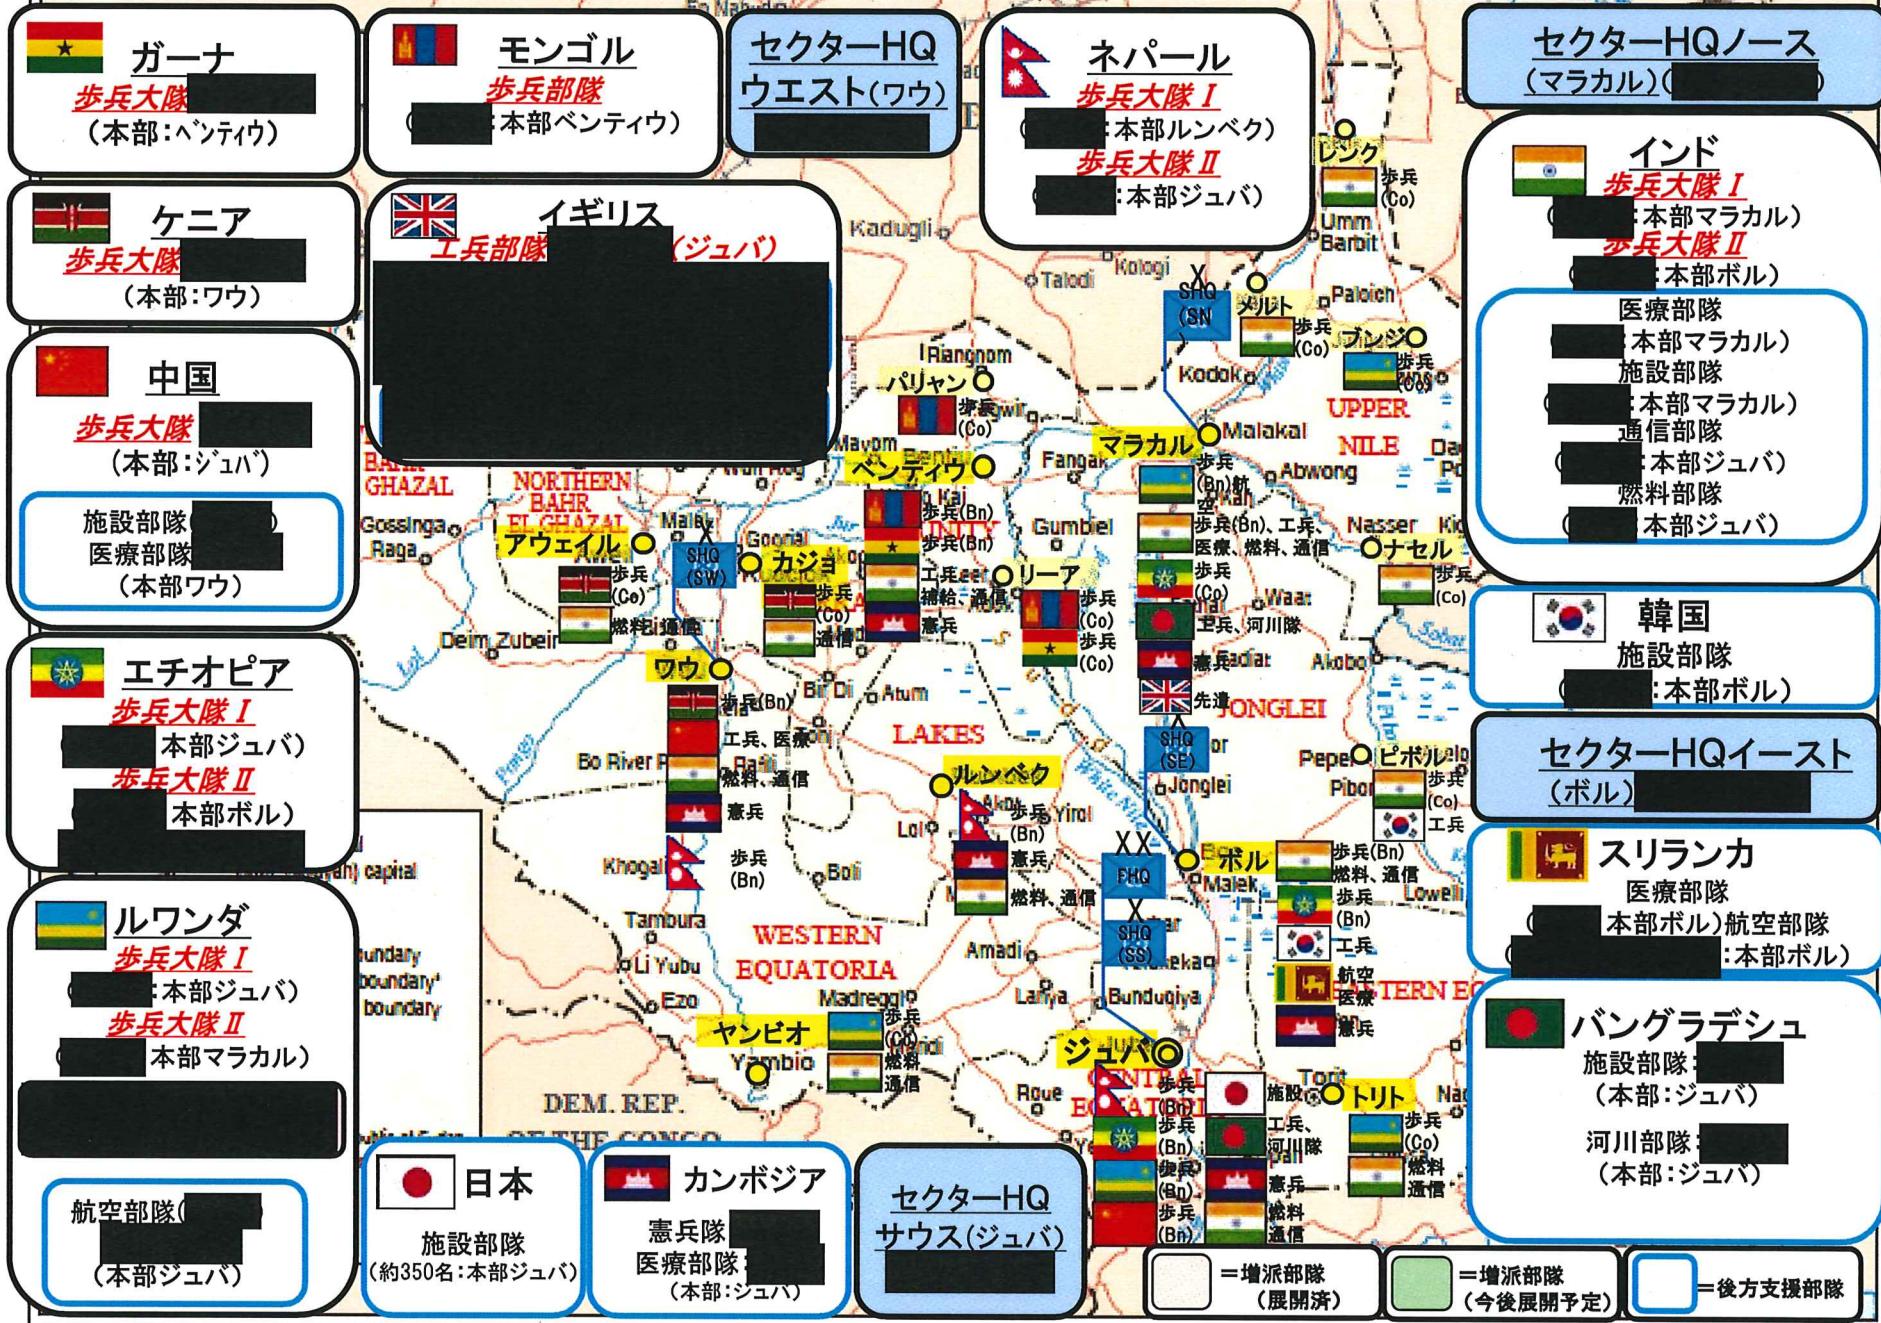

セクター・サウス内部隊状況（2016年7月4日現在）



エチオピア
歩兵大隊 I
(本部: ジュバ)

ネパール
歩兵大隊 II
本部: ジュバ)

中国
歩兵大隊
(本部: ジュバ)

ルワンダ
歩兵大隊 I
(本部: ジュバ)
航空部隊
(本部: ジュバ)

インド
通信部隊(本部: ジュバ)
燃料部隊(本部: ジュバ)

日本
施設部隊
(約350名: 本部: ジュバ)

バングラデシュ
施設部隊
(本部: ジュバ)
河川部隊
(本部: ジュバ)

カンボジア
憲兵隊: (本部: ジュバ)
医療部隊: (本部: ジュバ)

インド
歩兵大隊 II
ジュバ

エチオピア
歩兵大隊 II
ジュバ

派部隊
(展開済)

後方支援部隊

工兵課タスク優先順位

高 ↑
優先順位
↓ 低

#1 POCサイト南側外壁構築
(ハウス)

#1 POCサイト南側外柵補修
(ハウス)

凡 例

 : POC支援

 : 完了タスク

 : UN基盤整備

 : 未実施

プライオリティー

メインゲート支柱埋設孔穿孔
(ハウス)

メインゲートポスト移設
(ハウス)

メインゲート道路補修
(ハウス)

ウェストゲート暗渠増設
(トンピン)

マラム積載・運搬(ボリ村道路補修)
(ジュバ市内)

アコモデーション地区交差点補修
(ハウス)

トランスポート西側排水溝整備
(トンピン)

アコモデーション地区ケーブル埋設
(ハウス)

給水活動
(トンピン)

バイタル

ルーティン

新規タスク等一覧

※赤字：変化事項

新規タスク（7月3日（日）実施・完了）	
タスク名	ネパール歩兵大隊メダルパレード実施位置土砂運搬（ハウス）
意義	UN行事の基盤の向上に寄与
目的	ネパール歩兵大隊メダルパレード実施位置凹地への土砂運搬による同行事の円滑化
内容	土砂運搬
区分・期間	バイタル・1日間

タスク名変更	
タスク名	ウエストゲート道路拡幅 → ウエストゲート暗渠増設
意義	UNトンピン地区の活動基盤の向上
目的	ウエストゲートの暗渠を増設して、排水性を向上させる。
内容	暗渠の設置
区分・期間	バイタル・2日間

7月4日タスク等現況 (1/2)

凡 例 : POC支援 : UN基盤整備

1 実施中

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
391	POC 支援	1	#1 POCサイト南側 外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施 計画				
443	POC 支援	2	#1 POCサイト南側 外柵補修	UNハウス	ヘスコ補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
397	UN 基盤整備	3	メインゲート 支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施 計画				工兵課の指示 待ち
449	UN 基盤整備	4	メインゲートポスト 移設	UNハウス	ゲート・ ポスト移設	実施 計画				
398	UN 基盤整備	5	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる 道路補修	実施 計画				
450	UN 基盤整備	6	ウェストゲート 暗渠増設	UNトンピン	暗渠設置 道路拡幅	実施 計画				
351	UN 基盤整備	7	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・ 運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示 待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施 計画				工兵課の指示 待ち
447	UN 基盤整備	8	アコモデーション地区 交差点補修	UNハウス	交差点補修	実施 計画				
430	UN 基盤整備	9	トランスポート西側 排水溝整備	UNトンピン	排水溝浚渫	実施 計画				
333	UN 基盤整備	10	アコモデーション地区 ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝 掘開・埋設	実施 計画				工兵課の指示 待ち
451	UN 基盤整備	11	ネパール歩兵大隊 メダルパレード 実施位置土砂運搬	UNハウス	土砂運搬	実施 計画				
325	UN 基盤整備	12	給水活動	UNトンピン	給 水					

7月4日タスク等現況 (2/2)

凡 例	 : UN基盤整備 調整済: 工兵課と調整が終わったもの
-----	--

2 未実施
な し

タスク累計受領数（完了数）		タスク実施数（第10次隊）	
		プライオリティー	3
		バイタル	25
		ルーティン	1
451 (441)			29
		計	
		完 了	19
		実施中	10
		未実施	0

警備の態勢

活動写真等

