



1
28. 7. 71800c
南スーザン派遣施設隊

南スーザン派遣施設隊 日々報告

第1635号

報告項目

1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果
 - ア 活動概要
 - イ 活動成果
- (2) 明日の活動
 - ア 活動に及ぼす影響
 - (ア) 情 勢
 - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
 - (ウ) 総括（評価）
- イ 活動命令
 - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令
(方針・指導要領・各部隊の任務)
 - (イ) 視察・来隊予定
 - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

3 じ後の予定

4 情報共有事項

5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢
- (7) 活動写真等

1 本文（要約）

1 情 勢

(1) 全 域

ア 和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、各地域における双方の緊張状態の継続、用地接収に関する地域住民との調整、兵站及び資金上の問題に直面するものと見積もられ、和平合意の完全な履行には混合裁判所の設立を含め時間を要するものと思料

また、28州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、政府内におけるSPLA-IO等の反対は継続するものと思料され、動向に注目

イ その他の情報資料

南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。政府関係者に対する給料未払いも継続していることから、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料

南スーダンの北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で抗争が生起しており、暫定政府及び28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

(2) ジュバ市外

過去の事象から突発的なSPLAと武装集団による抗争、牛を巡る抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注意が必要。また、単発的な射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要

凡例 赤字：変化事項

(3) ジュバ市内

ジュバ市内、特にPOCサイトを含むUNハウス周辺では、射撃事案、経済の悪化に伴う治安事象、窃盗事案等が度々発生しており、巻き込まれに注意が必要。宿营地周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要。また、市内の緊張の高まりによるSPLA及び大統領警護隊からのハラスマント及び建国5周年に伴う市民の動向に注視が必要

(4) ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また [REDACTED] が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要

(5) 活動に及ぼす影響

ア ジュバ市外においては、突発的に抗争等が生起する可能性については、否定できず。巻き込まれに注意が必要

イ 宿营地周辺における射撃による流れ弾等に注意が必要

2 本日の活動成果

(1) 方針

隊は、現地の情勢変化、UNMISからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

この際、UNMIS主催の南スーダン建国5周年記念行事（スポーツ交流）に参加するとともに、記念行事会場の天幕構築支援を実施し、信頼関係の醸成を図る。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

#1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区におけるミフラム構築

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区における道路補修

b アコモデーション地区交差点補修

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における交差点補修

c ウエストゲート暗渠増設

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における暗渠の設置

d ログベース入口補修

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における土砂の充填及びヘスコ補修

(イ) 給水活動

給水組をもって、UNトンピン地区における給水活動

(ウ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

- a 第2科をもって、経路偵察を実施し、市内の安全状況の確認
- b 情報班をもって、ジュバ市内における情報収集活動
- c 隊本部等によるUNMISS司令部から情報収集

(イ) 業務調整等

- a 隊本部等による業務調整等
- b 本部付隊による宿营地管理業務

(ウ) 宿营地外整備

トンピン内道路整備（日本隊宿营地外柵地域）
施設器材小隊をもって、日本隊宿营地外柵南側地域の道路整備

(エ) 宿营地内整備

日本隊宿营地路盤補修
施設器材小隊をもって、日本隊宿营地内の路盤補修予定も降雨のため実施せず

(オ) 教育訓練等

隊本部等によるUNトンピン地区における車両操縦訓練

(カ) 民生協力

なし

(キ) 各小隊等から選出した要員による南スーダン建国5周年記念行事天幕構築支援

(ク) 隊本部によるジュバ空港へのウガンダ出張者輸送

(ケ) 隊本部によるジュバ市内における参議院議員選挙不在者投票使送者視察対応及び送迎

工 表敬等

隊長による、UNハウス地区におけるRRP (Reconstruction Reintegration Peacebuilding : 復興・再統合・平和構築) 部長代行表敬

才 各種行事

各小隊等から選出した要員による南スーダン建国5周年記念行事サッカートーナメント参加

力 国際機関等連携案件

なし

3 明日の活動予定

(1) 方針

隊は、現地の情勢変化、UNMISSからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

この際、UNMISS主催の南スーダン建国5周年記念行事（文化紹介、フードフェスティバル）に参加し、UNMISS参加各国との信頼関係を醸成する。

(2) 指導要領

ア 文民保護に資する活動

#1 POCサイト南側外壁構築

第2施設小隊をもって、UNハウス地区におけるミフラム構築

イ 人道支援実施のための環境作り等

(ア) 施設活動

a メインゲート道路補修

第1施設小隊をもって、UNハウス地区における道路補修

b アコモデーション地区交差点補修

第3施設小隊をもって、UNハウス地区における交差点補修

(イ) 給水活動

給水組をもって、UNトンピン地区及びUNハウス地区における給水活動

(ウ) インフラ整備

なし

ウ その他の活動

(ア) 情報活動

a 第2科等をもって、経路偵察を実施し、市内の安全状況の確認

b 情報班をもって、ジュバ市内における情報収集活動

c 隊本部等によるUNMISS司令部から情報収集

(イ) 業務調整等

- a 隊本部等による業務調整等
- b 本部付隊による宿営地管理業務

(ウ) 宿営地外整備

トンピン内道路整備（日本隊宿営地外柵地域）

施設器材小隊をもって、日本隊宿営地外柵南側地域の道路整備

(エ) 宿営地内整備

なし

(オ) 教育訓練等

警備小隊等によるジュバ市内及びUN トンピン地区における車両操縦訓練

(カ) 民生協力

なし

(キ) 隊本部によるジュバ空港へのウガンダ出張者輸送

工 表敬等

隊長等による、UN トンピン地区における工兵課長表敬

オ 各種行事

各小隊等から選出した要員によるUN トンピン地区における南スーダン建国5周年

記念行事参加

カ 国際機関等連携案件

なし

2 別紙（細部活動状況）

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第2 「情勢」

別紙第3 「装備品等現況」

別紙第4 「患者受診状況」

別紙第5 「人員現況」

別紙第6 「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第7 「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第8 「視察・来隊予定」

別紙第9 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

別紙第10 「全般活動予定表」

3 情報共有事項

別紙第11 「連携案件等情報」

1 本日の成果

別紙第1 「活動概要」
別紙第2 「活動成果」


活動概要 (UNトンピン地区) (1/6)

別紙第1-1

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両
①	施設	ウエストゲート暗渠増設	器材小隊	0830~1600	ウエストゲート	7	大型×1、油圧×1 ダンプ×1
②		ログベース入口補修	器材小隊	0830~1600	ログベース	6	油圧×1
③	その他	給水	給水組	0800~1000	トランジット	2	給水車×1
④	その他	給水	給水組	1000~1200	ネパール隊 バングラ河川隊	2	給水車×1
⑤		歯科患者送迎	衛生班	0950~1200	LV2 カンボジア病院	3	Amb×1
⑥		UN資材受領・払出 及び業者対応	隊本部 (S-4)	0830~1630	UNトンピン	2	なし
⑦		現場指導	器材小隊	0830~1600	ウエストゲート ログベース	2	小型×1
⑧		業務調整(施設)	隊本部 (S-3)	0820~1600	UNトンピン	4	高機×1
⑨		車両操縦練成	整備班	0800~1200		3	小型×1
⑩		車両操縦練成	隊本部 (S-4)	1300~1630		3	小型×1
⑪		SMM	隊本部 (S-3)	0930~1200	UNトンピン	2	
⑫		UNMISS主催南スー ダン建国5周年記念行事 (スポーツ交流)	各小隊等 隊本部 (S-1)	0850~1200	ルワンダ宿營地	16	大型×1、ランクル×1
⑬		UNMISS主催南スー ダン建国5周年記念行事 天幕構築支援	各小隊等 隊本部 (S-1)	1350~1600	PLAN B	7	大型×1
⑭	施設	トンピン内道路整備 (日本隊宿營地外柵地域)	器材小隊	0830~1600	UNトンピン	12	グレーダ×2、ローラ×1

凡例 UNタスク


活動概要（UNトンピン地区）（2／6）

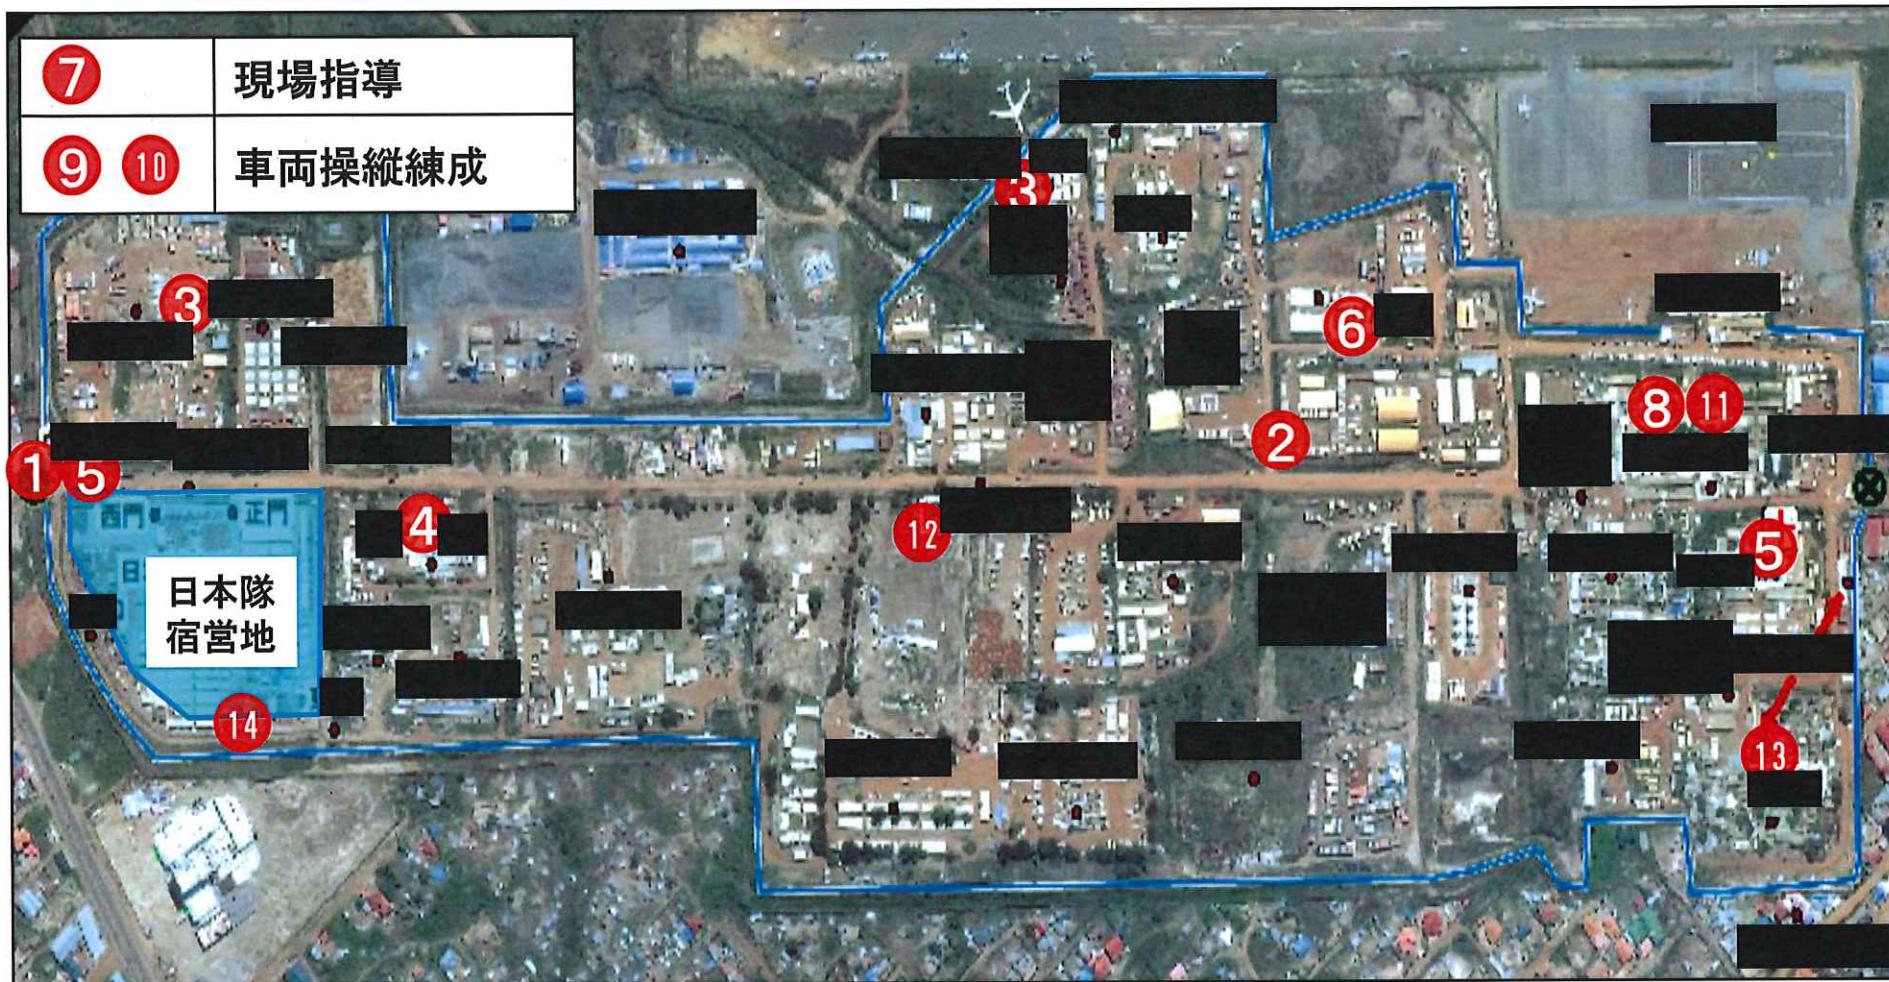


活動概要（UNハウス地区）（3／6）

別紙第1-3

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0800～ 1630	UNハウス	11	高機×1、中型×1 大型×1、油圧×1 小油圧×1 道障車×1	
②		#1 POCサイト 南側外壁構築	2小隊	0800～ 1600		14	高機×1、小型×1 中型×1 特大型×1 ユニック×1	
③		アコモデーション地区 交差点補修	3小隊	0800～ 1630		10	大型×1、小型×1 高機×1	
④	その他		隊本部 (S-3)	0800～ 1230	UNハウス	2	ランクル×1	
⑤		現場指導	1小隊	0800～ 1630		4	高機×1	
⑥		現場指導	警備小隊	0830～ 1200		3	LAV×1	
⑦		業務調整（涉外）	隊本部 (S-1)	0830～ 1600	UNハウス及び ジュバ市内	2	小型×1	
⑧		業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0800～ 1600		4	小型×1	
⑨		広報活動	広報班 隊本部	0830～ 1700		2	小型×1	

凡例  UNタスク


活動概要（UNハウス地区）（4／6）

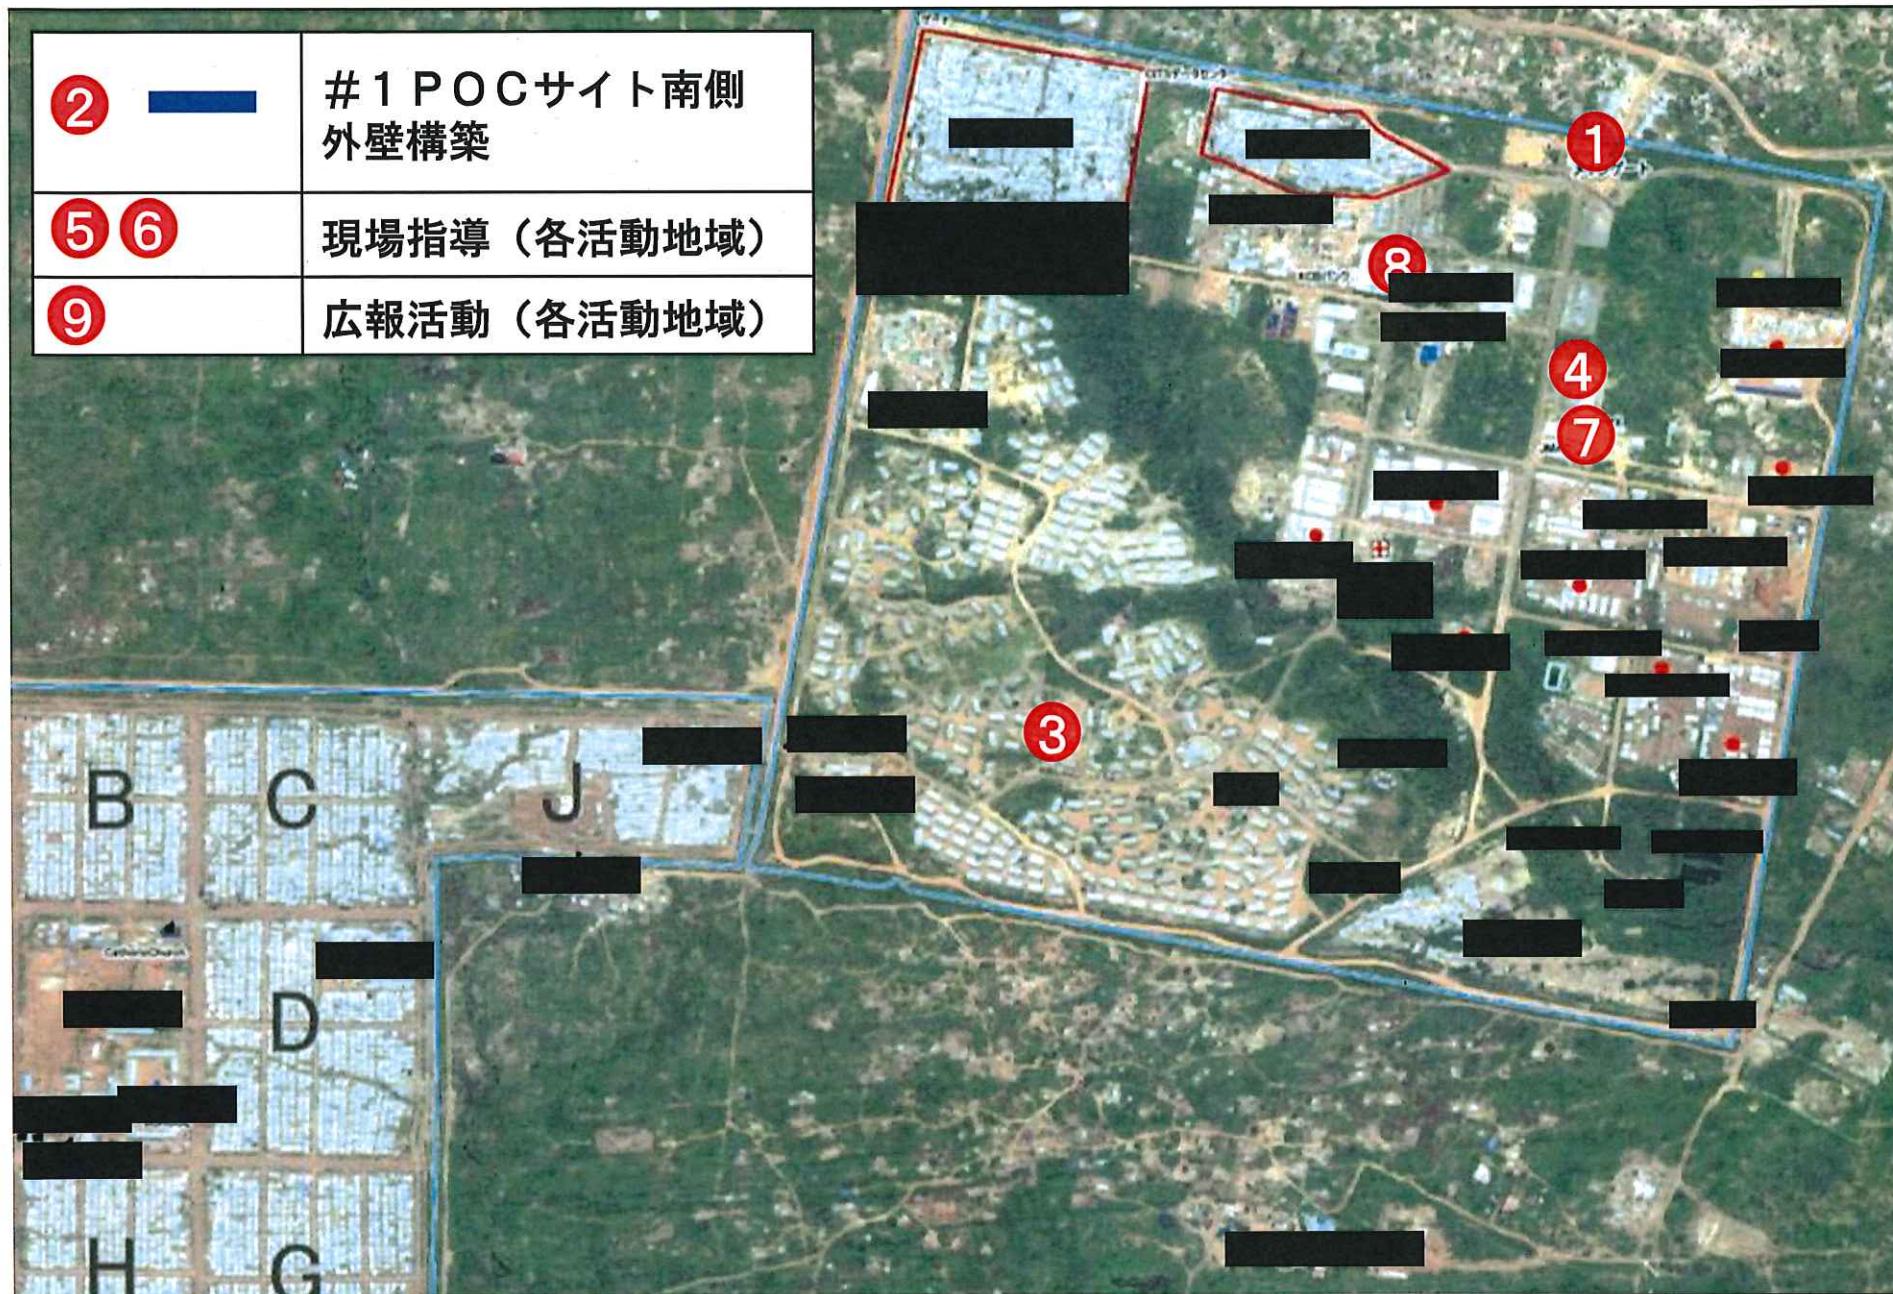

活動概要（ジュバ市内）（5／6）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		情報収集	情報班					
③		情報収集	隊本部 (S-2) (S-3)	0940～ 1200	日本大使館	5	高機×1	
④	その他	重車両輸送支援 情報収集	警務班	0700～ 1600	ジュバ市内及び UNトンピン	2	小型×1	
⑤		経路確認	警護班	0830～ 1600	市内全域	2	小型×1	
⑥		現地調達（会計）	隊本部 (S-4)	0930～ 1200	ブルーフラッグ	6	高機×1	
⑦		現地調達	隊本部 (S-4)	1330～ 1630	取水点	3	小型×1	
⑧		空港端末地輸送 (ウガンダ出張者輸送)	隊本部 (S-4)	0830～ 1300	ジュバ空港	4	小型×2	
⑨		経路確認 参議院選挙不在者投票 使送者送迎	隊本部 (S-3)	1430～ 1600	市内全域	2	ランクル×1	
⑩		業務調整（広報）	隊本部 (広報)	0800～ 1700	ジュバ市内	2	小型×1	

活動概要（ジュバ市内）（6／6）

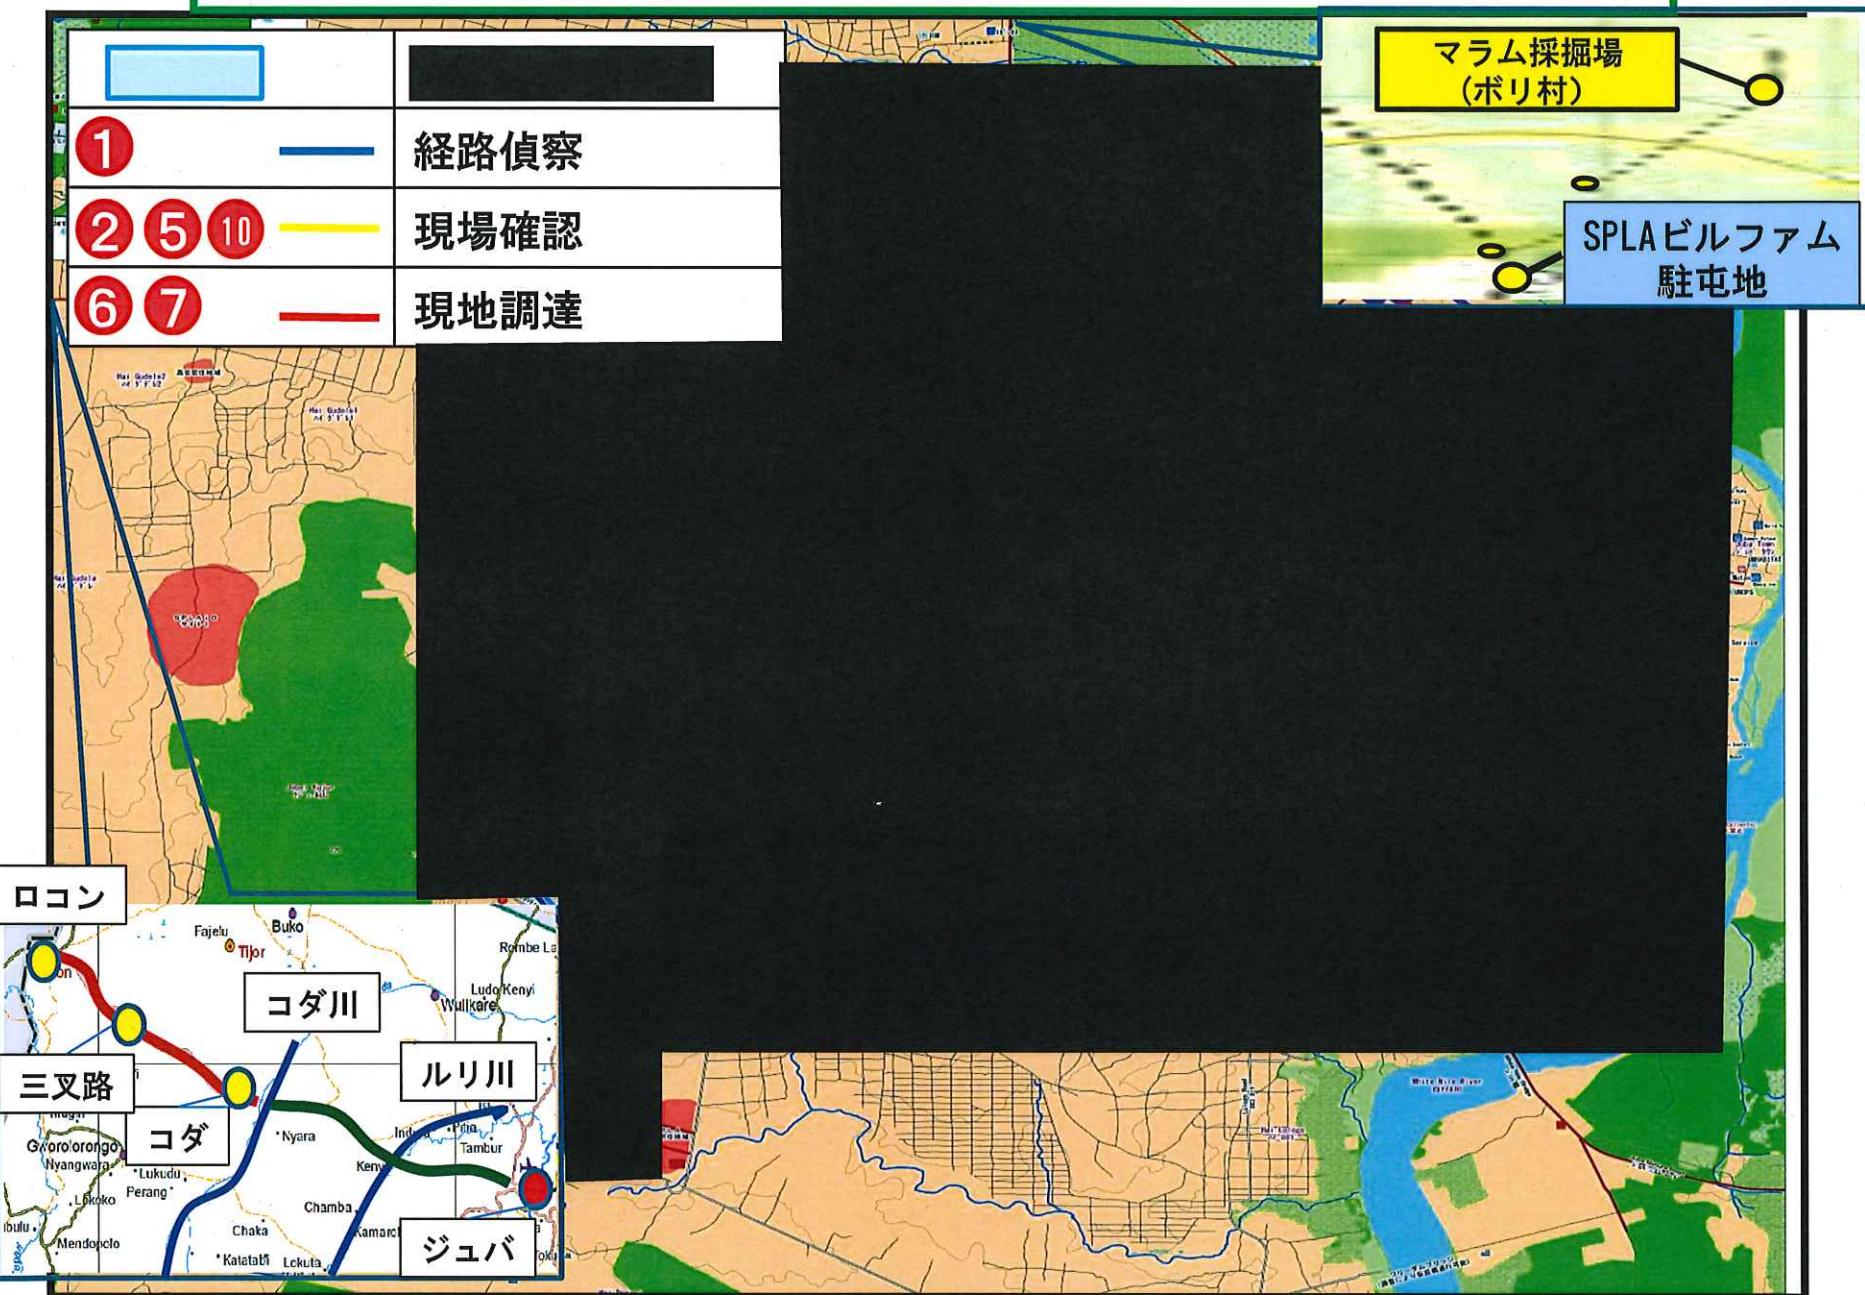

活動成果

ログベース入口補修

活動前

施設器材小隊【7.7 0900現在】



活動完了

施設器材小隊【7.7 1400現在】



活動成果

進度:

累計:

ログベース入口補修

活動成果

メインゲート道路補修

活動前

第1施設小隊【7.7 0930現在】



活動中

第1施設小隊【7.7 1200現在】



活動成果

進度
累計

- ・打設準備（測量・床掘り）
- ・排水作業

活動成果

アコモデーション地区交差点整備

活動前

第3施設小隊【7.7 0930現在】



活動中

第3施設小隊【7.7 1200現在】



活動成果

進捗
累計

養生

2 明日の活動

(1) 活動に及ぼす影響

別紙第3 「情勢」

別紙第4 「装備品等現況」

別紙第5 「患者受診状況」

別紙第6 「人員現況」

別紙第7 「総括（評価）」

(2) 活動命令

別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」

別紙第9 「視察・来隊予定」

別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

情 勢 (1 / 7) / Situation

21

別紙第3-1

凡例 青字：新規
赤字：評価

1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報

■ JMCC（合同軍事停戦委員会）のIO側代表は、内閣がJMCCにエクアトリア地域でのIO兵舎設立を指示したと発言、JMCCは6日に地域の確認とIO部隊への指示のための会議を実施する模様。なお、バハル・アル・ガザル地域のIO兵舎設立に関して、政府はCTSAMMによるIOの実態調査結果の提出を待っている模様（5日 Radio Tamazuj）

→ 兵舎の設立により和平合意履行へ一定の進捗があるものと思料される一方、CTSAMMによりIOの存在が認められた場合、IOの北部地域における勢力は大きくなり新たな抗争の火種となる可能性もあるため調査結果に注視

(2) 和平合意不履行に関する情報

■ ジュバ帰還後、IOの関係者約130名以上が逮捕拘留されているとしてIO広報官がSPLA及びNSSを非難し、「政府が事態解決に取り組まなければ、実力行使も辞さない」旨の発言をした模様

SPLA側は言及を避け、「6日に両者間で実施される会議の結果を待つ」と発言した模様（6日 Sudan Tribune, The Nation Mirror）

→ 逮捕の事実については不明であり、SPLA側の公式の発言及びIO側の新たな対応に注視

情 勢 (2/7) / Situation

別紙第3-2

凡例 青字：新規
赤字：評価

(3) その他入手した主要な情報資料

■ 5日、ワウにおいてSSRC（南スーダン赤十字）は、IDPに対して食糧、居住天幕の提供及び水汲み場の構築等を進めており、消息不明の家族探しのための支援窓口も開設した模様

① 治安が回復しつつあるものの、多くのIDPは物資提供と安全の保障された各所のIDPキャンプに留まっている模様



(5日 6日 The Dawn)

■ 6日、IOM（国際移住機関）は、ワウにおけるIDPを88,900人と発表した模様
(7日 The Nation Mirror)

→ 現在SPLA及びSSNPSによるワウ一帯の治安維持は実施しているが、同地域の安全が確保されない限り、IDPの帰還には更に時間要する恐れがあるため、引き続き注視

② ■ 5日夕、カポエタとトリトを結ぶ道路上にて民間車に対する武装強盗が2件発生し、合わせて5名死亡した模様


同地域を運行する乗合いバスは犯行を恐れて運行停止しており、地方当局については治安部隊を経路上に配置した模様
(6日 Eye Radio)

→ 経済状況の悪化に伴い、物資輸送車両や民間車両等を狙った同種事案は継続するものと思料

■ 6日、IOMは国内人口の3分の1が深刻な食糧不足に直面していることを警告した模様
(7日 The Nation Mirror)

→ 食糧目的の窃盗等の一般犯罪が増加するものと思料


情勢(3/7) / Situation

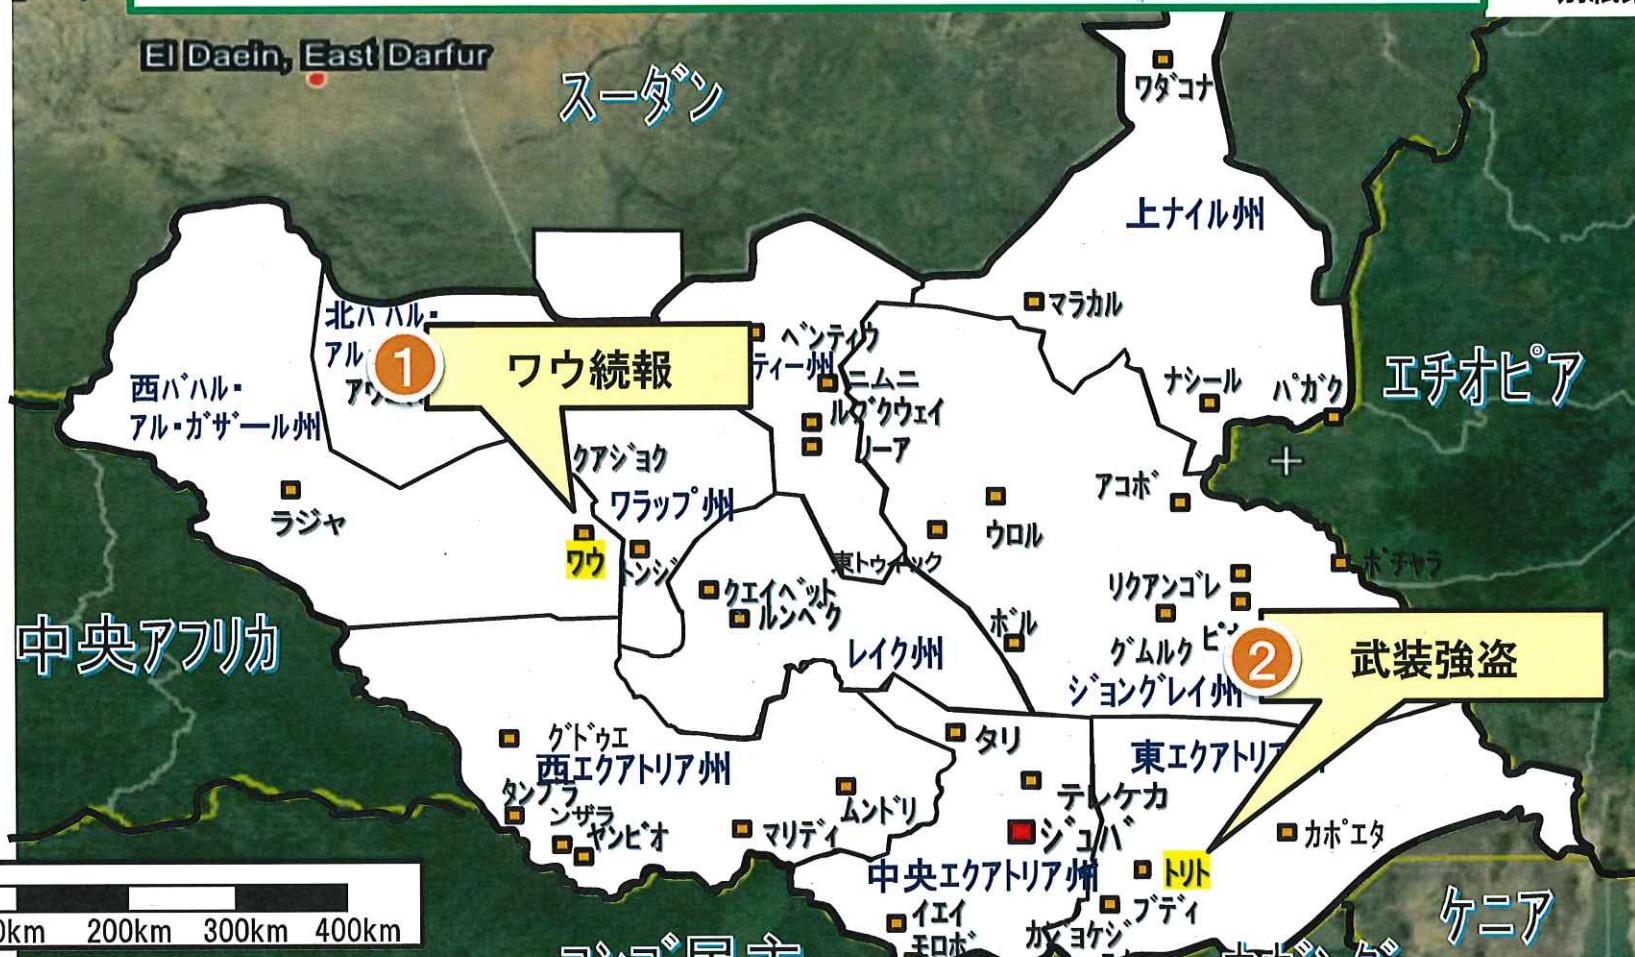

評価	和平合意	和平合意の進捗は進展が乏しく、各地域における双方の緊張状態の継続、用地接収に関する地域住民との調整、兵站及び資金上の問題に直面するものと見積もられ、和平合意の完全な履行には混合裁判所の設立を含め時間を要するものと思料。また、28州制については各地方における大統領側で既成事実化が進んではいるが、政府内におけるIO等の反対は継続するものと思料され、地方におけるIOの動向に注目
	その他の事象	南スーダン全域で経済状況の悪化は継続しており、市民生活に直結している模様。一部の政府関係者に対する給料未払いも継続していることから、治安機関による略奪等の犯罪が生起し治安状態が悪化する可能性があるものと思料。 南スーダンの北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団と SPLA 又は暫定政府との間で抗争が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復又は一般犯罪は継続するものと思料

情勢(4/7) / Situation

2 ジュバ市外の情勢

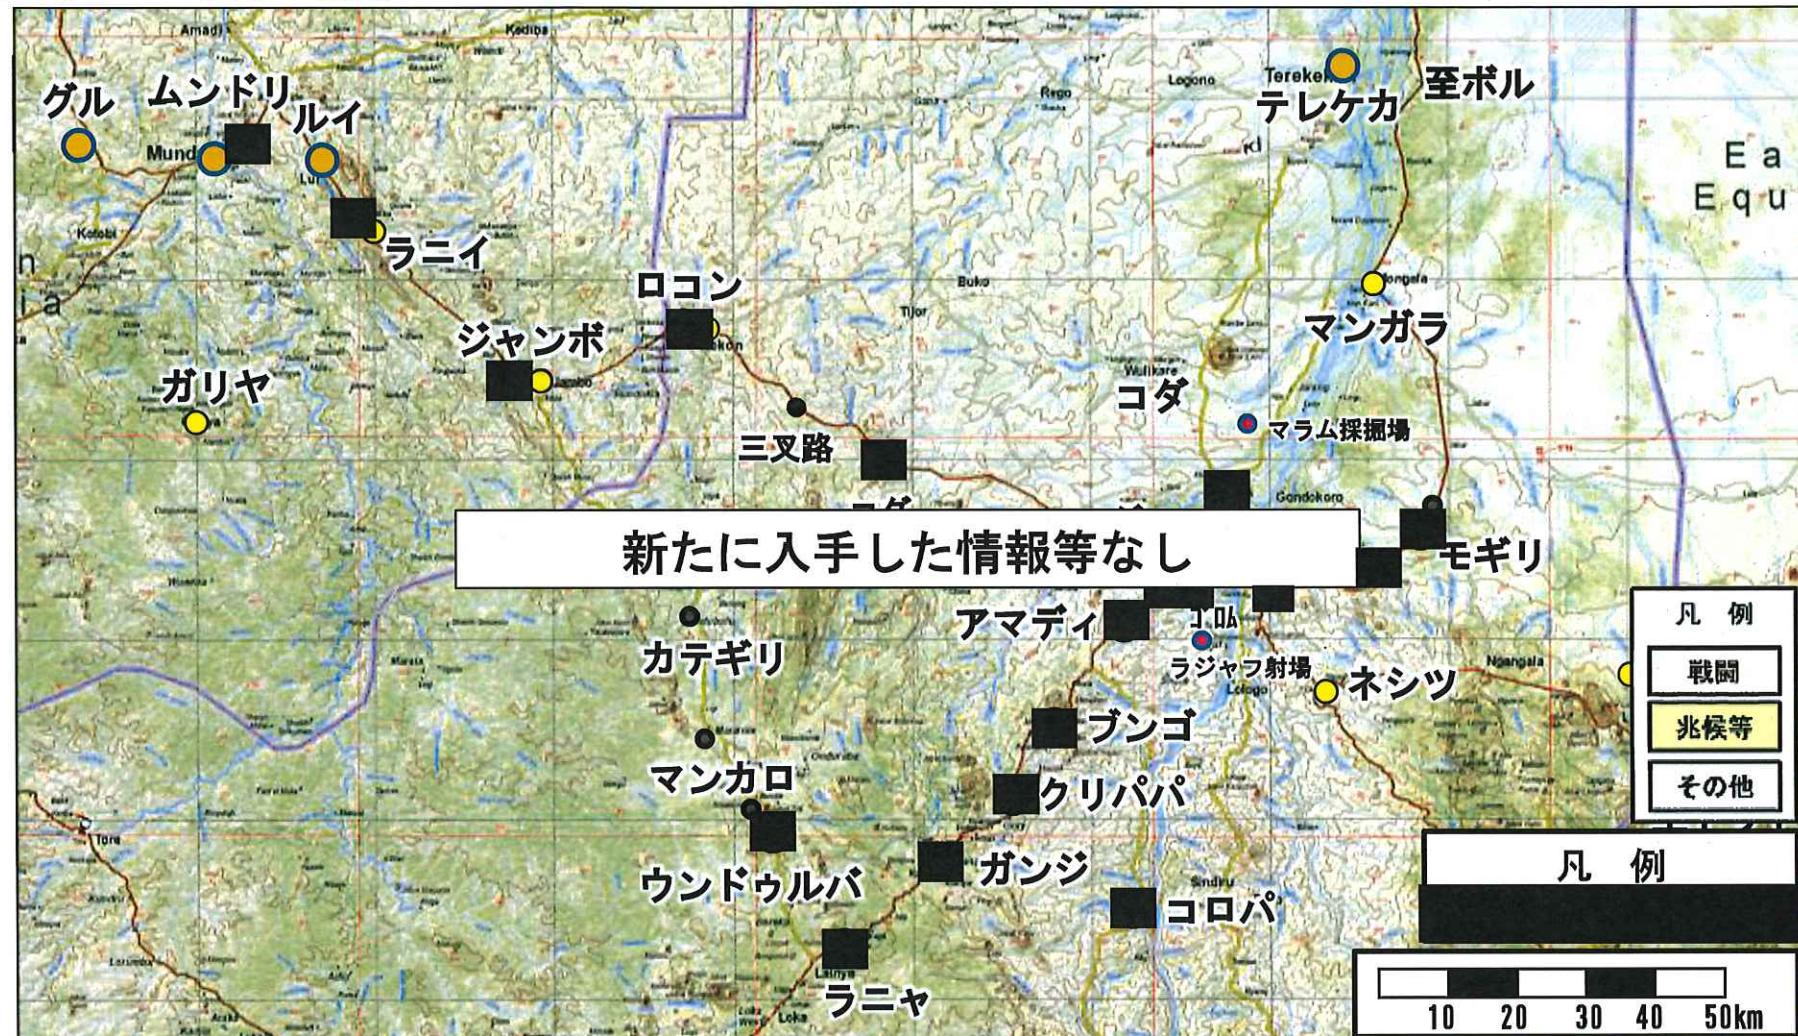

評価

過去の事象から突発的なSPLAと武装集団による抗争、牛を巡る抗争、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注意が必要。また、単発的な射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれに注意が必要

情勢(5/7) / Situation

3 ジュバ市内的情勢

- 4日2100頃、市内のレストランにおいて3名の武装強盗が金品強奪した模様
(6日 JUBA MONITOR)
- 経済の悪化に伴う治安事象及び窃盗事案等が度々発生しており、巻き込まれに注意が必要

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- 9日の独立記念日又は治安状況の悪化に関連した武器検索が市内で実施されているものと思料され、SOFA違反への対応には注意が必要



評価	ジュバ市内において経済の悪化に伴う治安事象及び窃盗事案等が度々発生しており、巻き込まれに注意が必要。また、POCサイト周辺での射撃事案に伴う流れ弾への巻き込まれ等に注意が必要であるとともに、市内の緊張の高まりによるSPLA及び大統領警護隊からのハラスマントに注意が必要			
----	--	--	--	--


情勢(6/7) / Situation

ジュバ市内の状況(0630~1400)

ジュバ市内特異事象

高官車両	なし
SPLA車両	8両
交通規制等	なし
警察等検問	なし
渋滞	通常
交通量	通常

- 凡例
- ピク : ピックアップトラック
 - テク : テクニカル トラック
 - : 特異事象
 - : 車両の移動等
 - ✗ : 故障車等
 - ✗ : 信号機故障
 - : 偵察経路
 - 工事中
 - GS渋滞
 - 通行止め

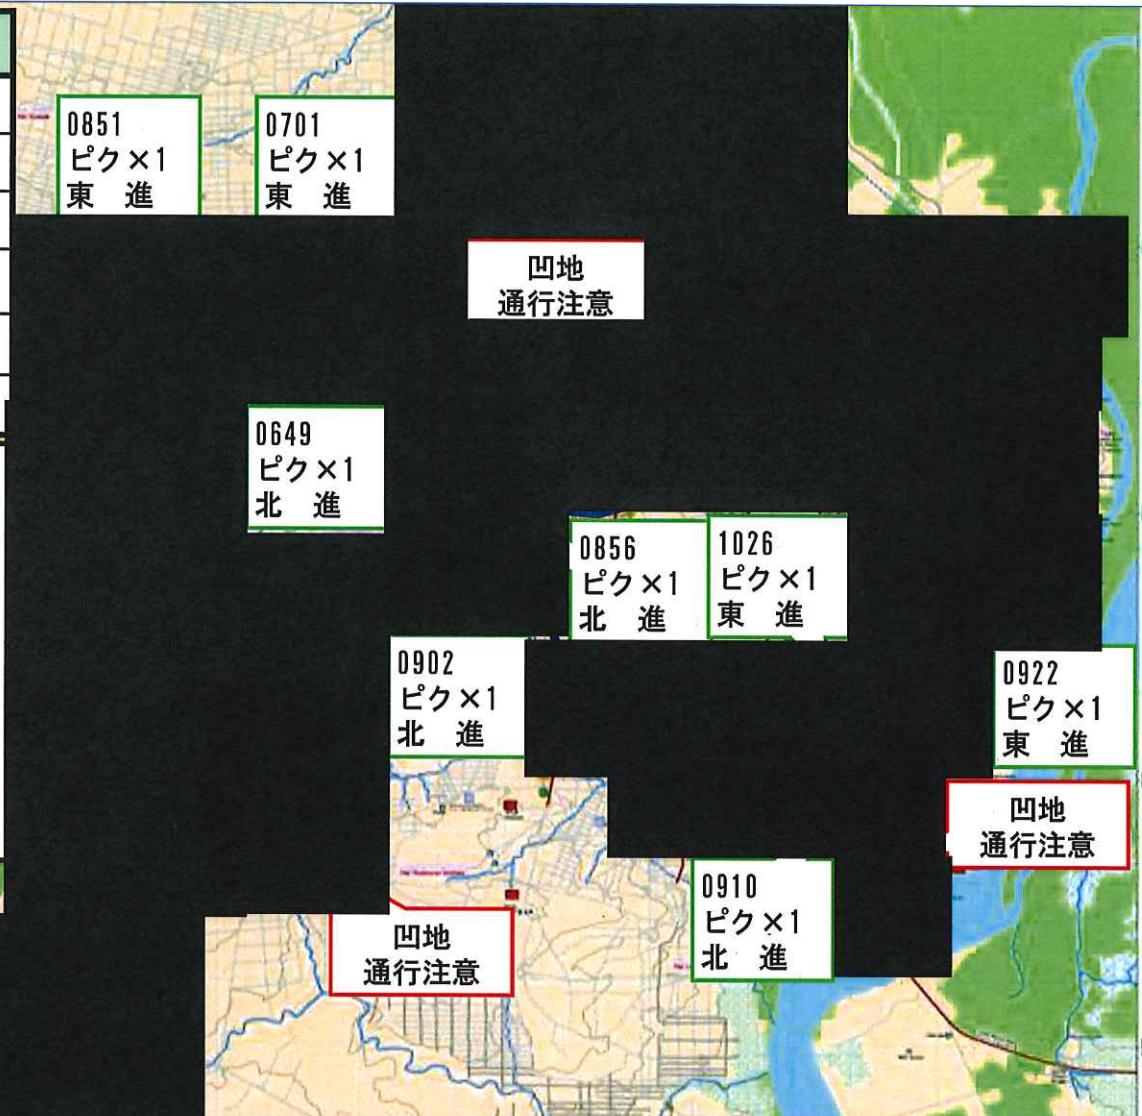

評価

SPLA及び高官車両の大規模な移動は確認できず、検問も見られなかった。市場についても通常通り開店しており、集会等は見られなかった。引き続き、SPLA及びSPLA-IO等の動向に注視が必要

情勢(7/7) / Situation

4 気象(0600i)

地 域	天 気	気 温		湿 度		降水量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	雨時々曇り	21°C	26°C	65%	76%	30mm	
カンパラ	晴れ時々曇り	20°C	26°C	53%	78%	0mm	

赤字：主要な
変化事項

主要装備品等現況／Equipment Status

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	高機同車のボンネット損傷 (自走可能)	(8月下旬整備完了予定)
施設	98%	モータグレーダの油圧バルブ作動油不足のため、不可動	(7月下旬整備完了予定)
通信	100%	なし	
需品	100%	なし	
衛生	100%	なし	

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第3-2

7月7日1600c

区分	品名	総数	取得	返納	保管
弾薬	BL	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	TR	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	計				
	打ち殻	9mm打がら薬きょう			
		5.56mm打がら薬きょう			
計					

燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

別紙第3-3

7月7日 1600c

区分	品名		取得	消費	現保有量	維持日数	備考
糧食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型					
		市販型					
		アルファ米					
		UN非常用糧食					
	耐久品	米					
		副食パック					
	UN食材	冷凍・耐久					
		生鮮					
	現地調達	生鮮					
		冷凍					
燃料	軽油(調達品)						
	軽油(UN)						
	灯油(調達品)						
	ガソリン(調達品)						
水	飲料水						
	生活用水(浄水用薬剤)						
	海水淡水化装置(浄水)						
日用品	トイレットペーパー						
	ゴミ袋						


第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

別紙第3-4

7月7日 1300c

【H28.7】(10次要員)

曜 日		浄水量	消費量	貯水量 (残量)
木	30			
金	1			
土	2			
日	3			
月	4			
火	5			
水	6			

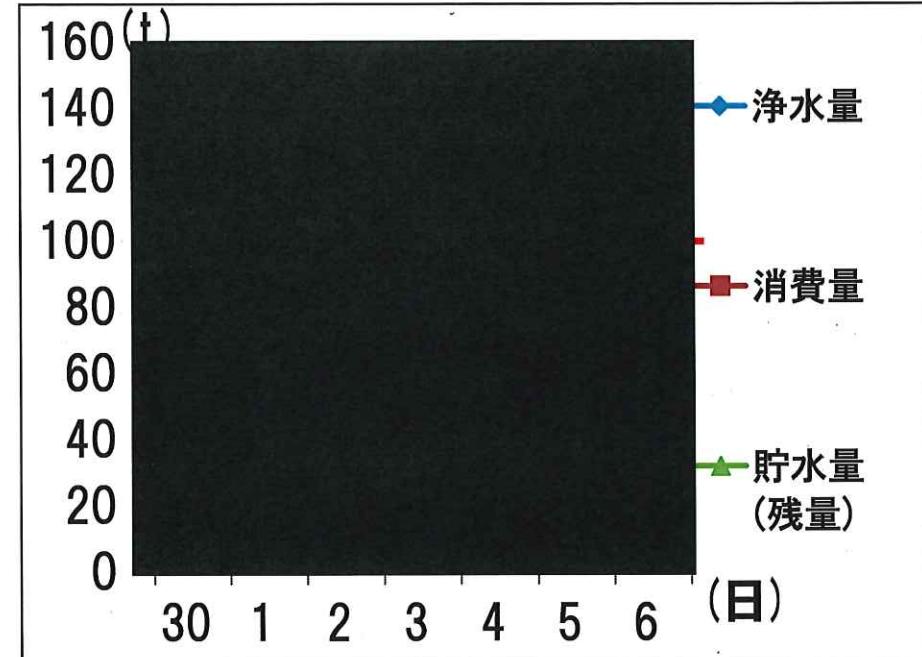

【評価】

消費量 [] であり問題ない。節水を継続的に実施

※ 貯水の危険水位: []

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が [] を超える日が [] で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

【今後の見積】

雨量の減少及び器材の劣化等による急な取水量の減少が予想される。

【対策】

平日の節水による貯水量の確保

凡例 — 消費量の目安ライン

患者受診状況

受診患者 11名

7月 6日 1800c
~7月 7日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
隊本部	3名		
本部付隊	3名		
第1施設小隊	2名		
第2施設小隊	2名		
第3施設小隊	1名		

凡例： (再) → 再 診

人員現況／Personnel Status

別紙第5

7月7日1800c

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10 次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	2	351	○ウガンダ出張2名	○ウガンダ出張 会計幹部(7/5~8) 後方運用幹部(7/7~8)

宿营地待機人員

区 分	人員数
待機人員	

赤字：主要な
変化事項

総括(Assessment)

項目	事象	評価	運用への反映	
情勢	1 マンガラにおける武装グループによる襲撃(6/7, 14) 2 宿营地周辺より射撃音を確認(6/1, 14, 20, 23, 30) 3 ジュバ市街地におけるハラスマントの発生(6/13, 14, 18) 4 UNハウス周辺において、射撃事案が発生(6/5, 13, 14, 29, 7/2) 5 ワウにおける武装グループによる襲撃(6/24) 6 リア郡におけるSPLAとIOの抗争(6/26) 7 市内においてパレードの練成(7/1) 8 ラマダン祭の開催(7/6) 9 市内において武器検索の兆候(7/6)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ジュバ市外においては、突発的に抗争等が生起する可能性については否定できず、巻き込まれに注意が必要であるとともに、宿营地周辺及び市街地における射撃による流れ弾、ハラスマント等に注意が必要である。 <p style="color: red;">また、ラマダン祭の混雑による、人員の飛び出し及び窃盗には注意が必要である。</p> <p>また、POCサイト周辺ではIDP同士の抗争、射撃、薬物使用者による事故等への巻き込まれに注意が必要である。</p>	活動に支障なし	
基盤上	兵站	1 グレーダコントロールバルブ付近の油圧ホース破損 2 高機動車のボンネット損傷	1 グレーダを必要とする作業に直接影響を受ける。 2 自走可能	現運用上支障なし
	衛生	受診患者 11名	活動に影響なし	活動に影響なし
	人事	第10次要員 351名 (ウガンダ出張2名)	活動に影響なし	活動に影響なし
その他	1 UNハウスメインゲート工事中 2 UNトンピンウェストゲート工事中	1 UNハウスイーストゲートに通行統制 2 UNトンピンウェストゲート通行制限の可能性あり	当面の間、出門の際、通行可能なゲートを使用	

明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する行動命令
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定
(CO/DCO/CSM Schedules)

7月8日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

1 情勢報告参照

2 (1) 隊は、現地の情勢変化、UNMISSからの指図及びCRFの指揮により施設整地等、文民保護に資する活動主体に実施するとともに、UN施設強化・整備、UN施設外における活動等、人道支援実施のための環境作りの活動を実施する。

この際、UNMISS主催の南スーダン建国5周年記念行事（文化紹介、フードフェスティバル）に参加し、UNMISS参加各国との信頼関係を醸成する。

(2) 警備レベル

3 (1) 共通

UNMISS主催の南スーダン建国5周年記念行事に一部の要員をもって参加

(2) EqPt (施設器材小隊)

トンピン内道路整備

(3) 1EPt (第1施設小隊)

UNハウスメインゲート道路補修

(4) 2EPt (第2施設小隊)

#1POCサイト南側外壁構築

(5) 3EPt (第3施設小隊)

アコモデーション地区交差点補修

(6) SecPt (警備小隊)

ア 2名を記念行事文化紹介組に差出

イ Pt (-)

宿营地警備

(7) HQU (本部付隊)

ア 長を記念行事文化紹介組に差出

イ U (-)

記念行事（フードフェスティバル）支援、給水活動、宿营地維持・管理活動及び

(8) MISec (情報班)

ジュバ市内における情報収集

(9) MPSec (警務班)

重車両輸送支援

(10) GuardSec (警護班)

経路偵察

(11) 記念行事文化紹介組

2名／SecPt、1名／HQU

ア 長 本部付隊長が指名する者


イ UNMISS主催の南スーダン建国5周年記念行事において文化紹介（太鼓）を実施

4 本職不在間は、副隊長が指揮

活動概要（UNトンピン地区）（1／6）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両
①	その他	給 水	給水組	0800～ 1000	トランジット	2	給水車×1
②	施設	トンピン内道路整備 (日本隊宿营地外柵地域)	器材小隊	0830～ 1600	UNトンピン	11	グレーダ×2、ローラ×1
③	その他	給 水	給水組 隊本部 (広報)	1000～ 1200	MSA3	4	給水車×1、高機×1
④		工兵課長表敬	隊本部 (S-3)	1350～ 1440	UNトンピン	7	ランクル×1、高機×1
⑤		UN資材受領・払出 及び業者対応	隊本部 (S-4)	0830～ 1630	UNトンピン	2	なし
⑥		現場指導	器材小隊	0830～ 1600	ウエストゲート ログベース	2	小型×1
⑦		業務調整（施設）	隊本部 (S-3)	0820～ 1600	UNトンピン	3	高機×1
⑧		車両操縦練成	隊本部 (S-4)	0830～ 1630		3	小型×1
⑨		UNMISS主催南スー ダン建国5周年記念行事 (文化交流等)	各小隊等 隊本部 (S-1) (広報)	1430～ 1900	PLAN B	20	大型×2


活動概要（UNトンピン地区）（2／6）

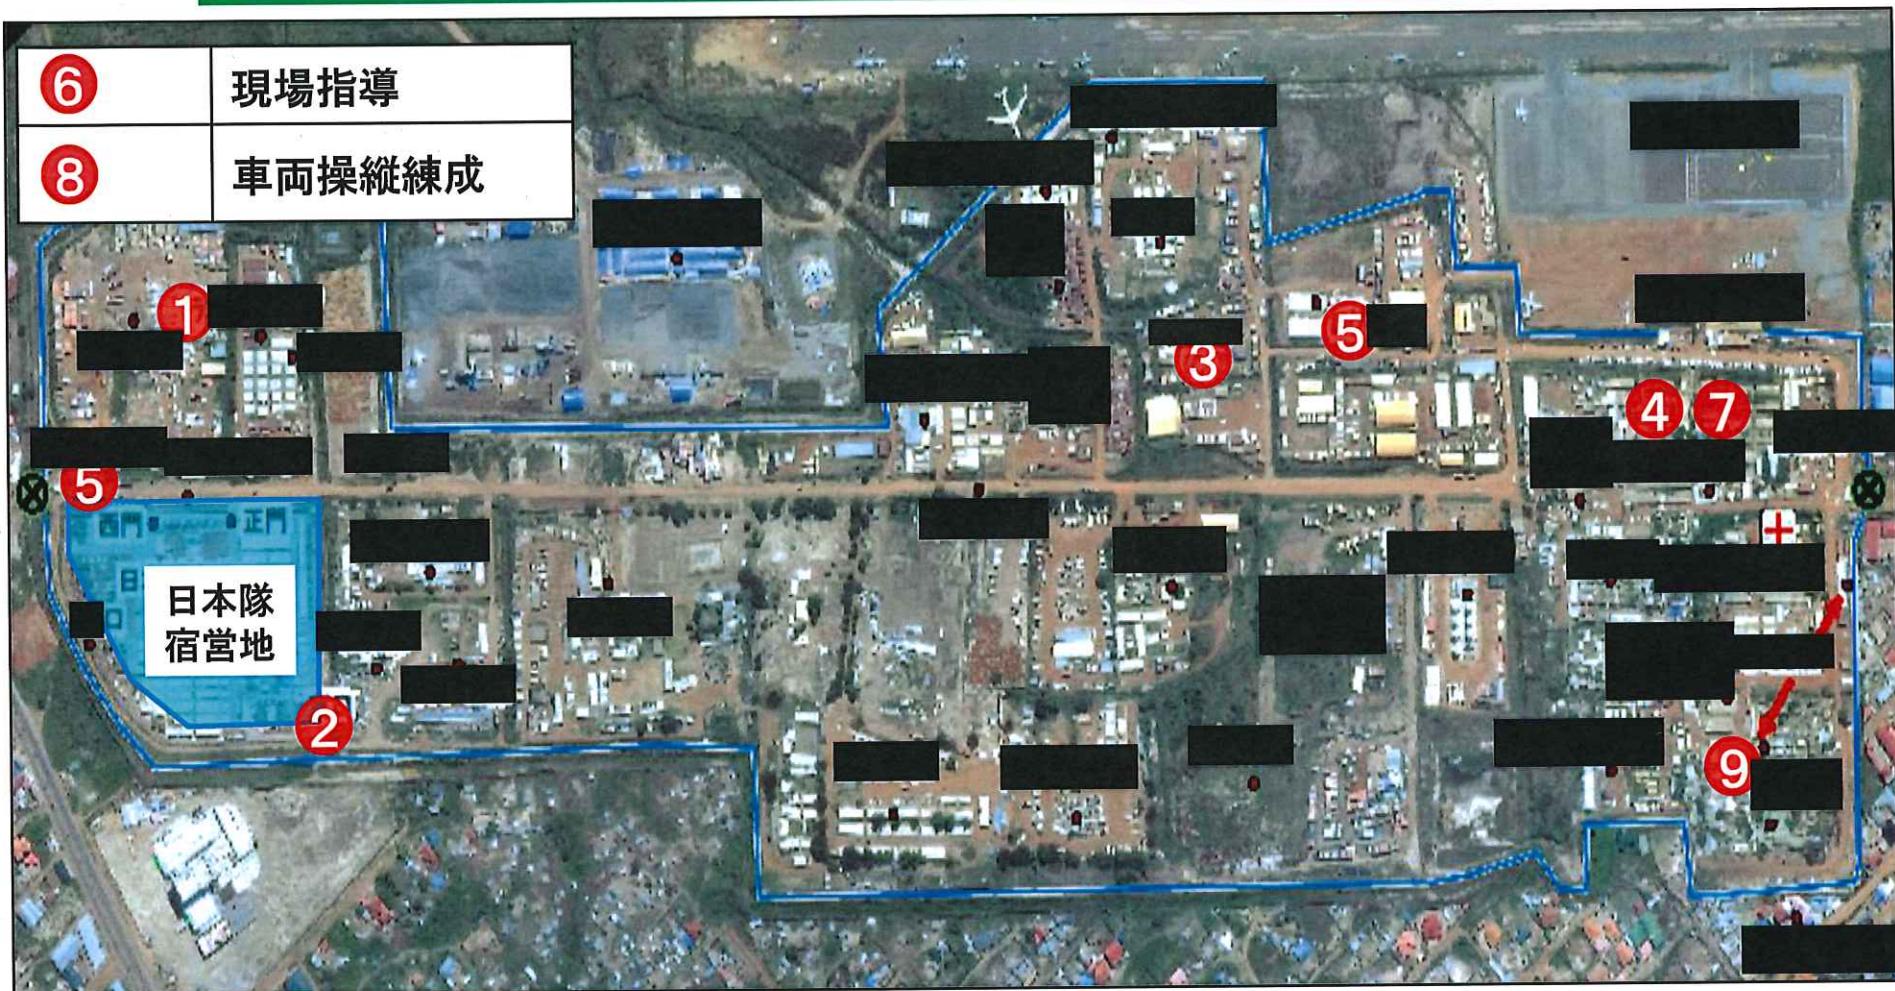

活動概要(UNハウス地区) (3/6)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	メインゲート道路補修	1小隊	0800~1630	UNハウス	24	高機×1、中型×1 大型×2、道障車×1 油圧×1、小油圧×1 特大型×1	
②		#1POCサイト 南側外壁構築	2小隊	0800~1600		28	高機×1、小型×1 中型×1、大型×2	
③		アコモデーション地区 交差点補修	3小隊	0800~1630		20	大型×2、小型×1 高機×1、ROV×1	
④	その他	給水	補給班	0800~1200	UNハウス	4	給水車×1、小型×1	
⑤	その他	現場指導	1小隊	0800~1630	UNハウス	7	高機×1	
⑥		現場指導	警備小隊	0800~1200		3	LAV×1	
⑦		業務調整(涉外)	隊本部(S-1)	0830~1600		2	小型×1	
⑧		業務調整(施設)	隊本部(S-3)	0800~1600		3	小型×1	
⑨		広報活動	隊本部(広報)	0830~1700	UNハウス及び ジュバ市内	2	小型×1	

活動概要(UNハウス)(4/6)

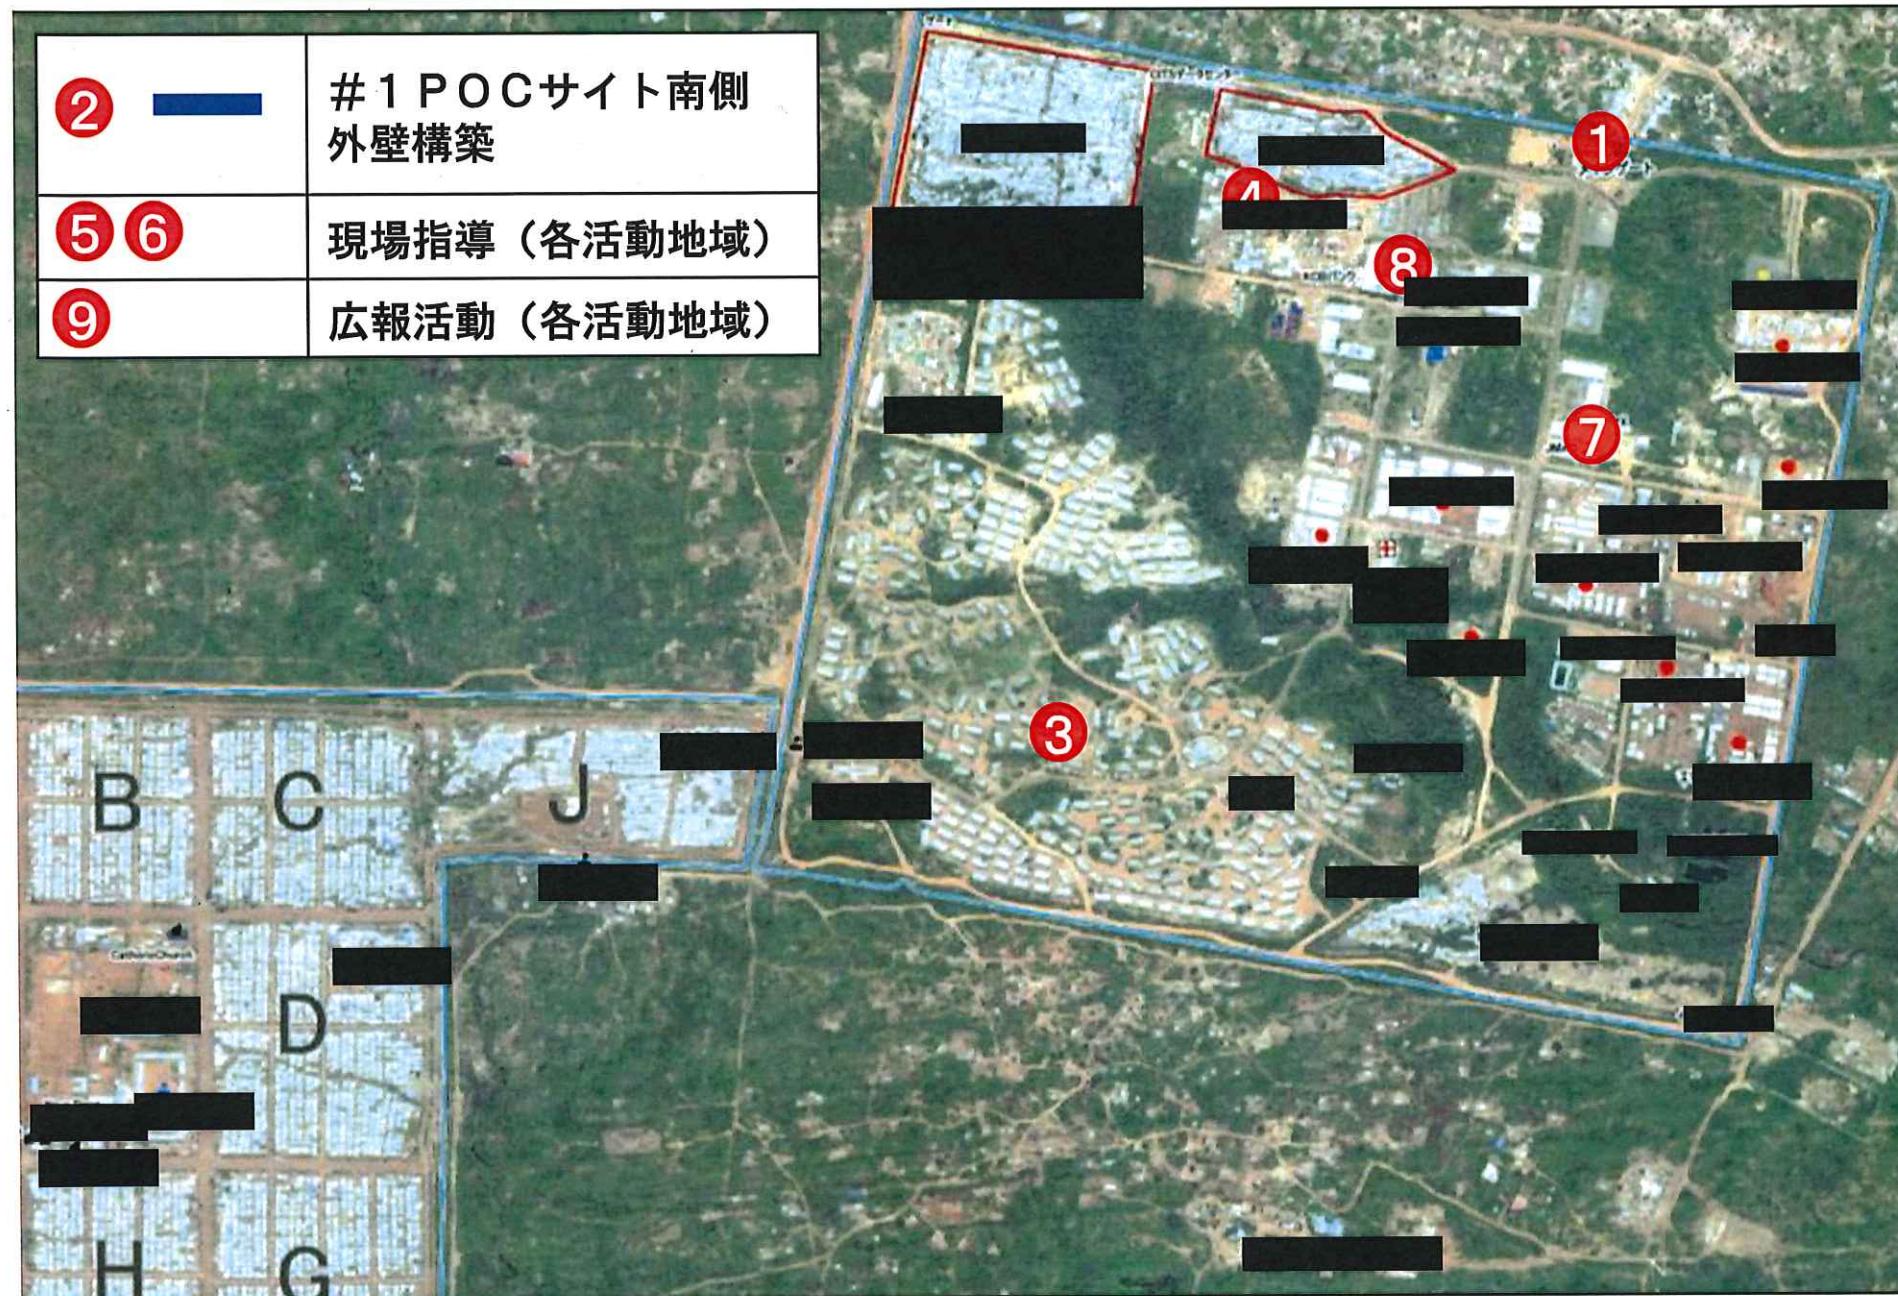

活動概要（ジュバ市内）（5／6）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2)					
②		情報収集	情報班					
③	その他	重車両輸送支援 情報収集	警務班	0700～ 1600	ジュバ市内及び UNトンピン	2	小型×1	
④		Gpカウンセリング 現地偵察	警護班 隊本部 (S-1)	0830～ 1600	市内全域	1	ランクル×1	
⑤		業務調整（連絡）	隊本部 (S-3)	0920～ 1200		2	小型×1	
⑥		両替業務及び 現地調達（会計）	隊本部 (S-4)	0915～ 1200	ジュバ市内	5	高機×1	
⑦		空港端末地輸送 (ウガンダ出張者輸送)	隊本部 (S-4)	1300～ 1830	ジュバ空港	6	小型×2	

活動概要（ジュバ市内）（6／6）



視察・来隊等予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
別 示	○ バングラ工兵中隊との夕食会 少佐以下5名	工兵幕僚 (S-3対応)

隊長、副隊長の行動予定 (CO/ DCO Schedule)

別紙第9-1

	AM	PM	課業外
隊長			
副隊長			

最先任上級曹長の行動予定 (CSM Schedule)

別紙第9-2

	AM	PM	課業外
最先任 上級 曹長			

3 じ後の予定

別紙第10「全般活動予定表」

7月間業務予定

別紙第10-1

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間活動予定 (7/3~7/9) 第30週

49

別紙第10-2

日曜日	7/3 日	7/4 月	7/5 火	7/6 水	7/7 木	7/8 金	7/9 土
-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							

赤字：変化事項
青字：隊長関連

週間活動予定（7／10～7／16）第31週

50

別紙第10-4

日	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

4 情報共有事項

別紙第11「連携案件等情報」

連携案件等情報

1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	● #1担当会同(6/21)を実施し、情報を収集完了 ● 7月8日1000よりMTC-JICAとの#2会同	MTC JICA	● MTC側で隊の能力と先方ニーズとの合致状況の確認中 ● じ後、訓練対象・時期等を検討し、大綱仰指予定	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	8月下旬～9月上旬予定 情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチングイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJIに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4		リオ五輪南ス選手壮行会における文化紹介支援	JICA	時期・内容(実施の有無含む) 未定	JICA	情報収集中	
5	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	● 工兵課からタスク発出済み	UNOPS (大使館)	● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定 ● 調査は、先方がサンプルを宿营地に持ち込み(1日程度)	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan : 包括的農業マスター プラン

※2 UN Office for Project Services : 国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例 ◎： タスク化成立 ○： 自隊による実施 ×： 実行の可能性低 一： 調整中

2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

5 參考資料

気象(7~8日) ジュバ / Weather in JUBA

最高気温(1400
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
26°C	21°C	65%	30mm



日(曜) Date	7日(木)				8日(金)			
時 Hrs	18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動	会計ウガンダ出張							
Juba	天 气							
	気温(°C)	23	23	22	22	24	28	29
	降水確率	80%	30%	20%	20%	10%	20%	20%
	雨 量	0mm	1mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
	風 向	東南東	東北東	南	南	南	南南西	北
	風 速	1	1	1	1	1	1	1
	評価	施設活動	問題なし					
	Assessment	行事	問題なし					

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

気象(週間) / Weekly Weather


日(曜)	9日(土)	10日(日)	11日(月)	12日(火)	13日(水)
主要な活動	UNの基盤整備			UNの基盤整備	
Juba	天 气				
	気温(°C)	29/21	31/22	28/21	30/21
	降水確率	40%	20%	70%	40%
	雨 量	1 mm	3 mm	8 mm	2 mm
	評 価				
Kampala	天 气				
	気温(°C)	25/20	24/21	24/20	23/19
	降水確率	10%	0%	0%	20%
	雨量	0mm	0mm	0mm	0mm
	評 価				

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WEATHER UNDERGROUND

評 価 Assessment	1 ジュバについては、期間を通じて降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性
	2 ウガンダは、天候が安定しているものの、突然の雷雨等には注意が必要

使送者 帰国経由地気象

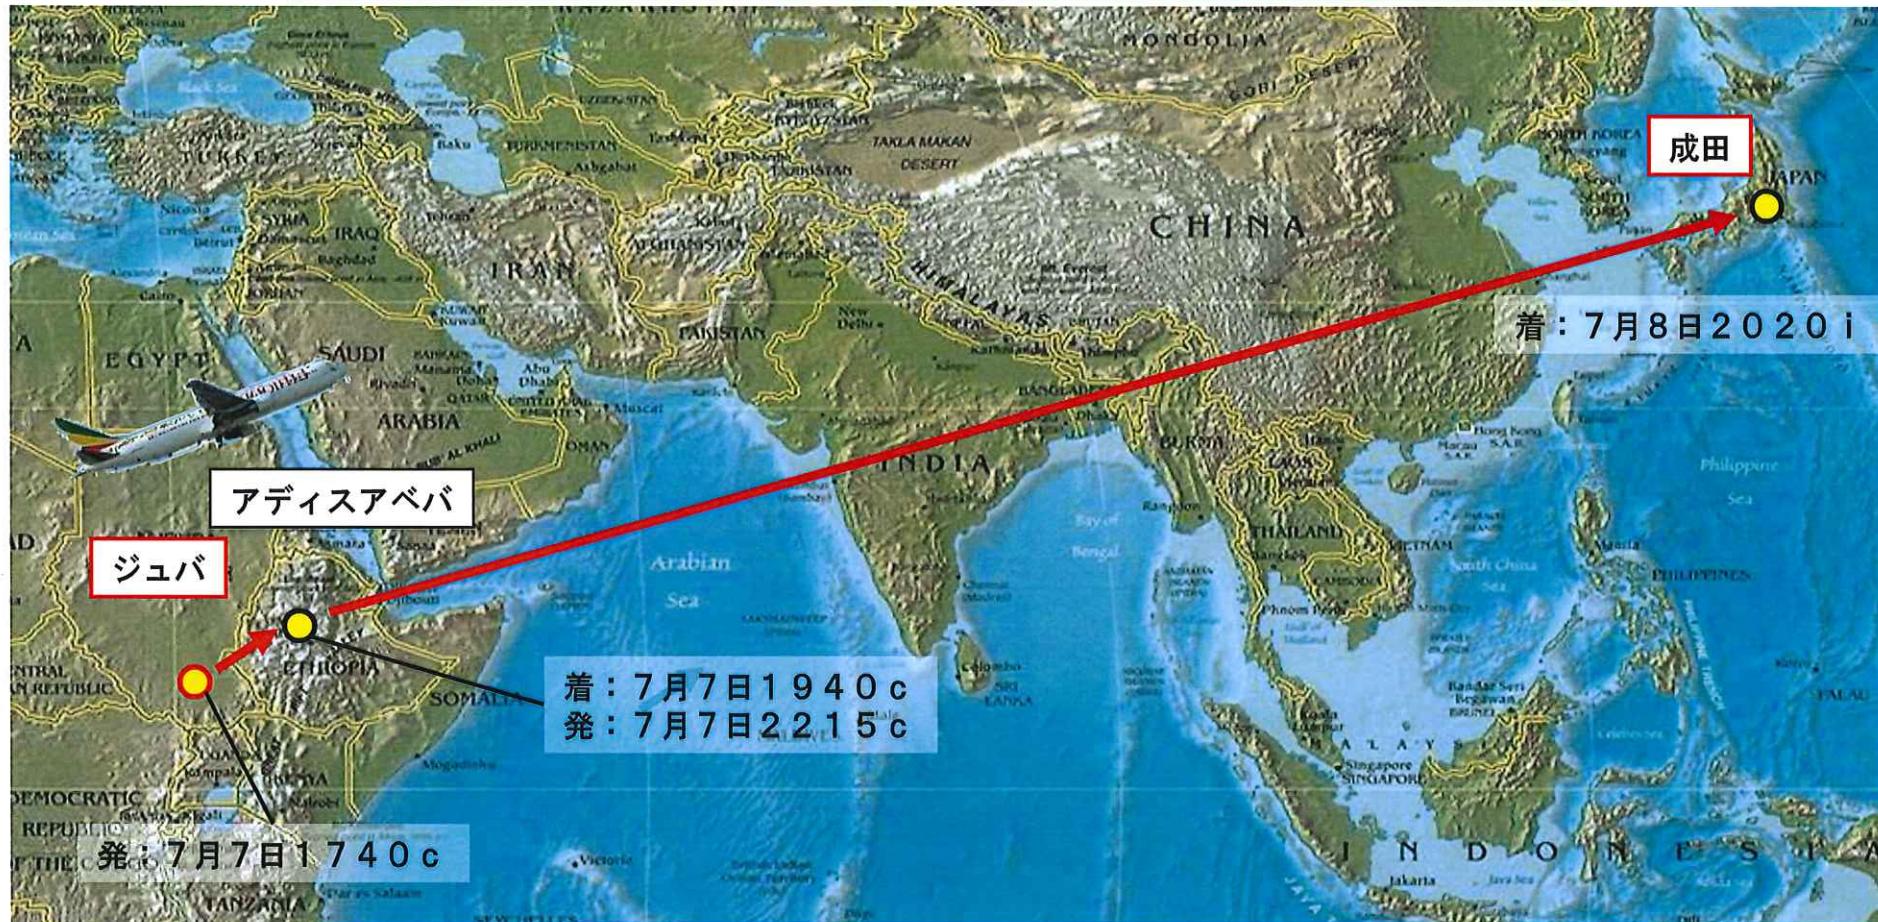

経由地	ジュバ	アディスアベバ	成田
7月7日	雨 28 / 21	雨 21 / 12	雨 36 / 22
7月8日	晴雨 31 / 22	晴雨 22 / 12	云 32 / 22

暫定政府樹立までの主要結節 / Major events until TGoNU establishment

57

区分		9月	10月	11月	12月	1月
全般	8.26			26 27	22	12 22
軍 和平合意署名	停戦	27 兵力引き離し		移動中告 26		
	外国軍撤退		12 撤退完了 20 移動開始 30 撤退完了			
	ジュバ非武装化	27 24. 開始 移転先選定中		23. 終了 一部移転 (2コBn 250名)	JMEC会議 →IO不参加	
	統合	即時開始	26 部隊勢力配分決定		JMEC会議	JMEC会議 暫定政府樹立
	国会議会の拡大			23 追加議員配分	26 定数拡大完了	5 追加議員提出 延期
	権力配分				23 ポスト配分会議	7 ポスト配分決定
	選挙		1ヵ月以内 選挙委員会再構成	暫定政府樹立	延期	
	憲法修正	即時 憲法委員会組織 18 修正案起草	修正案採択	6 大統領署名 修正委員議長指名		

和平合意の履行状況／Process of Peace Agreement

58

区分	2月	3月	4月	5月	6月	7月	評価
全般	2 9 23	9 16 24	21 25 26 29 29 29	31	23		
軍	停戦	CTSAMM会議	IOの一 部ジュバ帰還(24・ 28)	IOの一部ジュバ 帰還(15・ 21)	マシヤル氏ジ ュバ帰還	暫定政府樹立	JMEC会議
	外国軍撤退	CTSAMM会議	多 数派 別指 定の決 定	先 行 指 定の決 定	議會運 営開始	第1回暫定 政府会議	州境委員会会議(28州問題)
	ジュバ 非武装化	MM会議	閣僚の任 命	議會運 営開始	議會運 営開始	議會運 営開始	議會運 営開始
	統合	JMEC会議	大臣 指名	運 営 開 始	運 営 開 始	運 営 開 始	運 営 開 始
政府樹立	国会議会の拡大	JMEC会議	選 挙 委 員 選 定	選 挙 委 員 会構 成	27	2.2 部隊 完了	2.2 部隊 完了
	権力配分		憲法修 正案提 出	修正案 議會採 択	修正案 議會採 択	8.0 選 挙 実 施	8.0 選 挙 実 施
	選挙		憲法修 正案提 出	修正案 議會採 択	大統領 署名	憲法 発布	憲法 発布
憲法修正							

CTSAMM:暫定治安措置監視メカニズム

凡例 赤字:変化事項

予想シナリオと我に及ぼす影響／Expected Scenario & Effects

2015.8


▼ 2016.7

2018 →

安定

和平
合意

合意履行状況

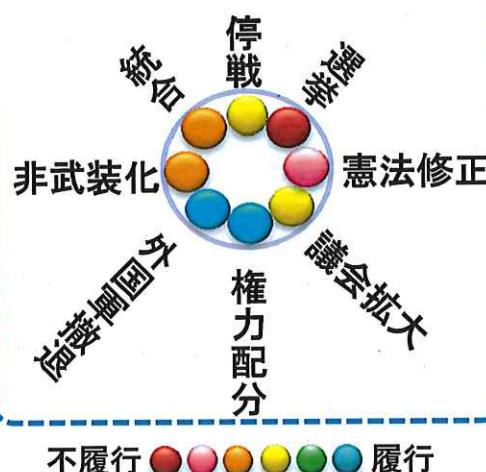暫定
政府

不安定要素

政府
樹立

不安定

我に及ぼす影響


関係悪化モデル

- ジュバの内戦状態に伴う UN活動の停止
- 武力衝突・REDACTEDに伴う、活動の制限
- ジュバ市内への大量の IDP の流入
- チェックポイント警戒強化(我の移動制限)
- ウガンダからの物流の停止


和平成立モデル


- 治安改善に伴う UNマンデートの変更
- 少数派による 新体制批判デモ
- 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
- SPLAと地元住民との係争
- 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

部隊配置状況（2016年7月4日現在）

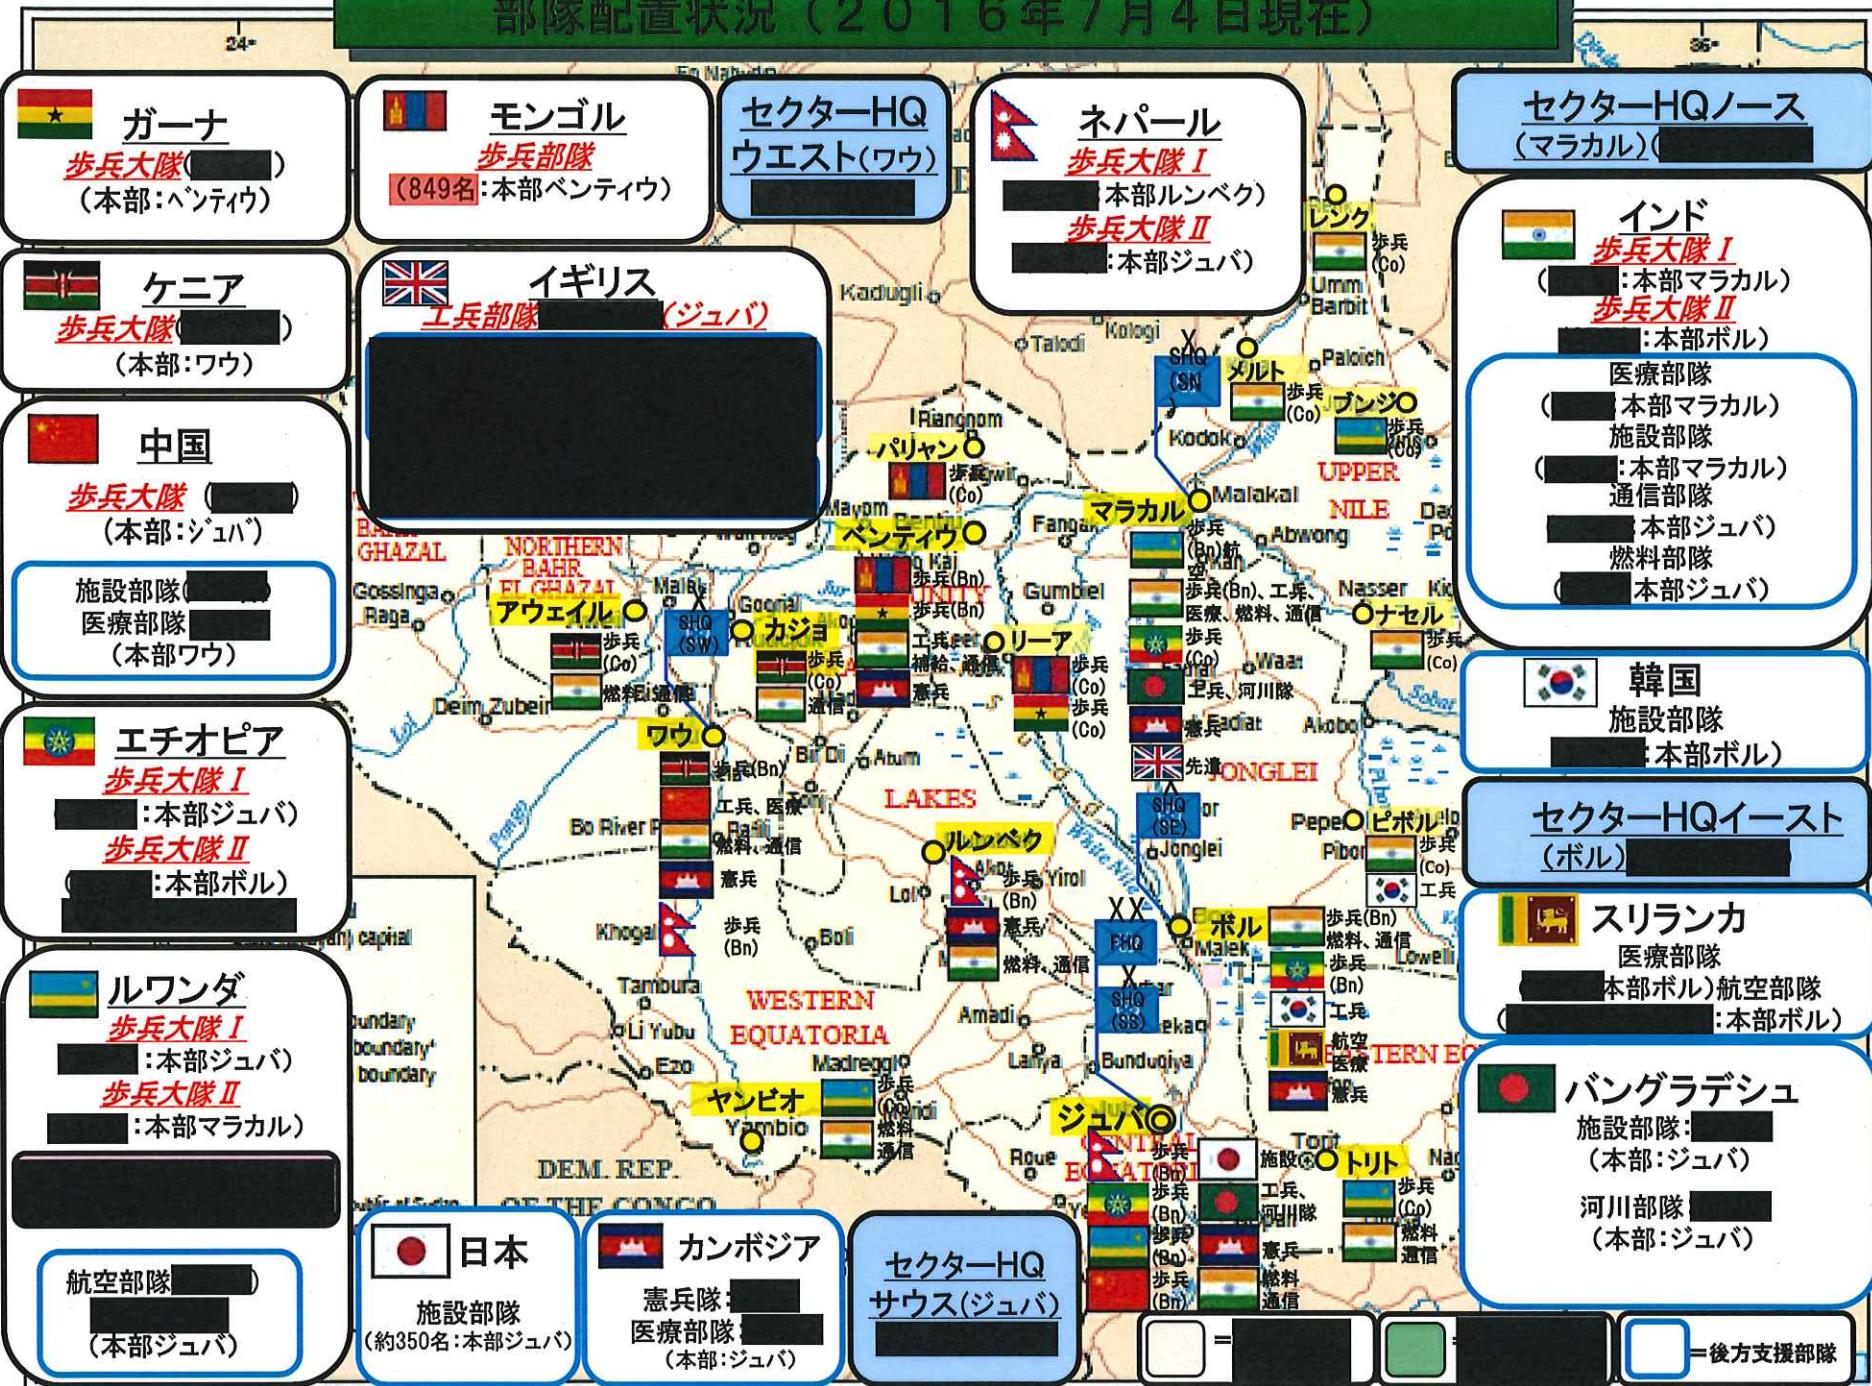

セクターサウス内部隊状況（2016年7月5日現在）

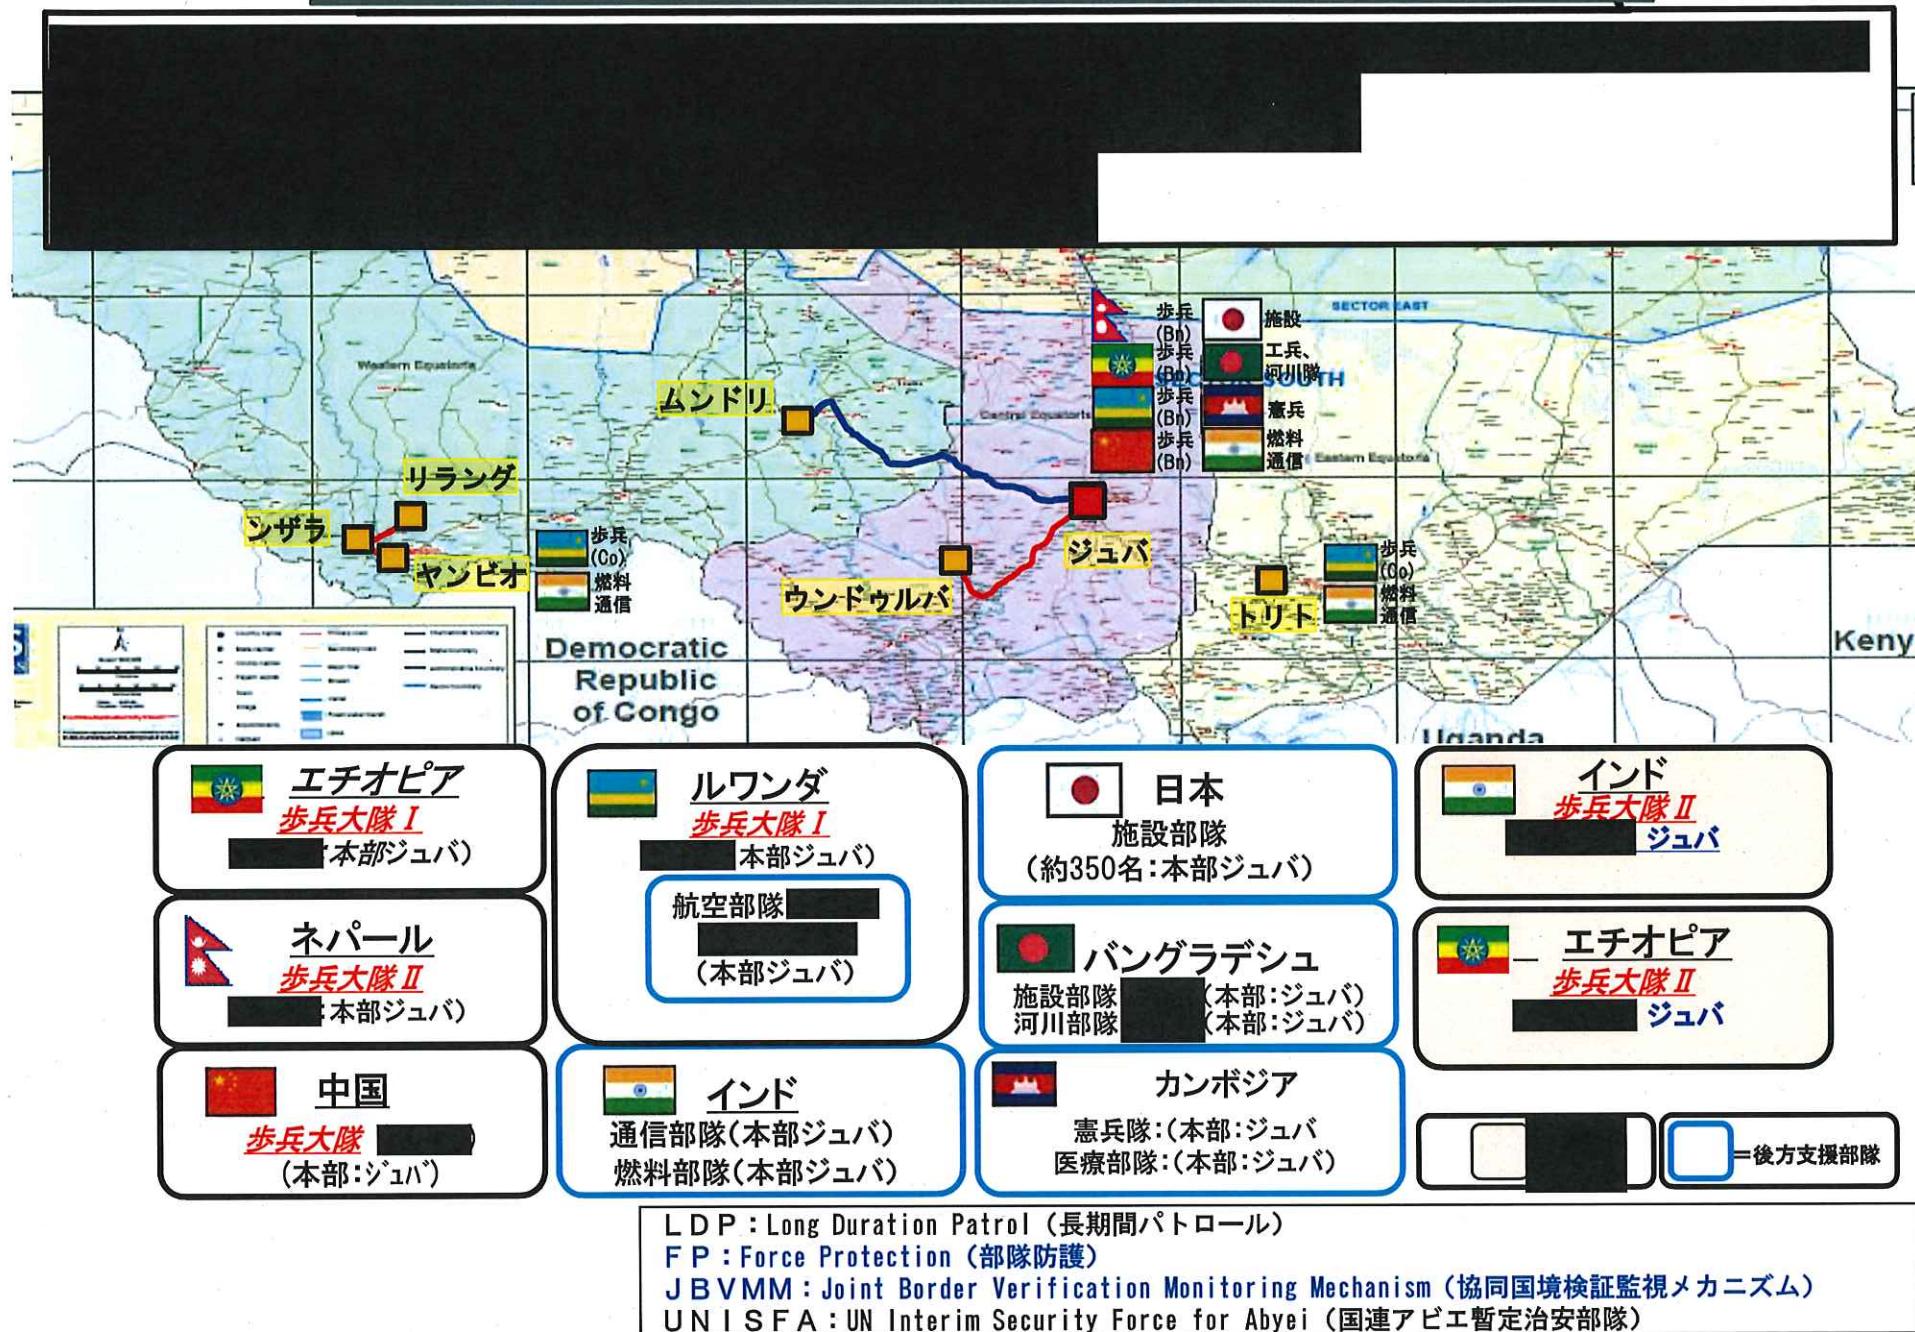

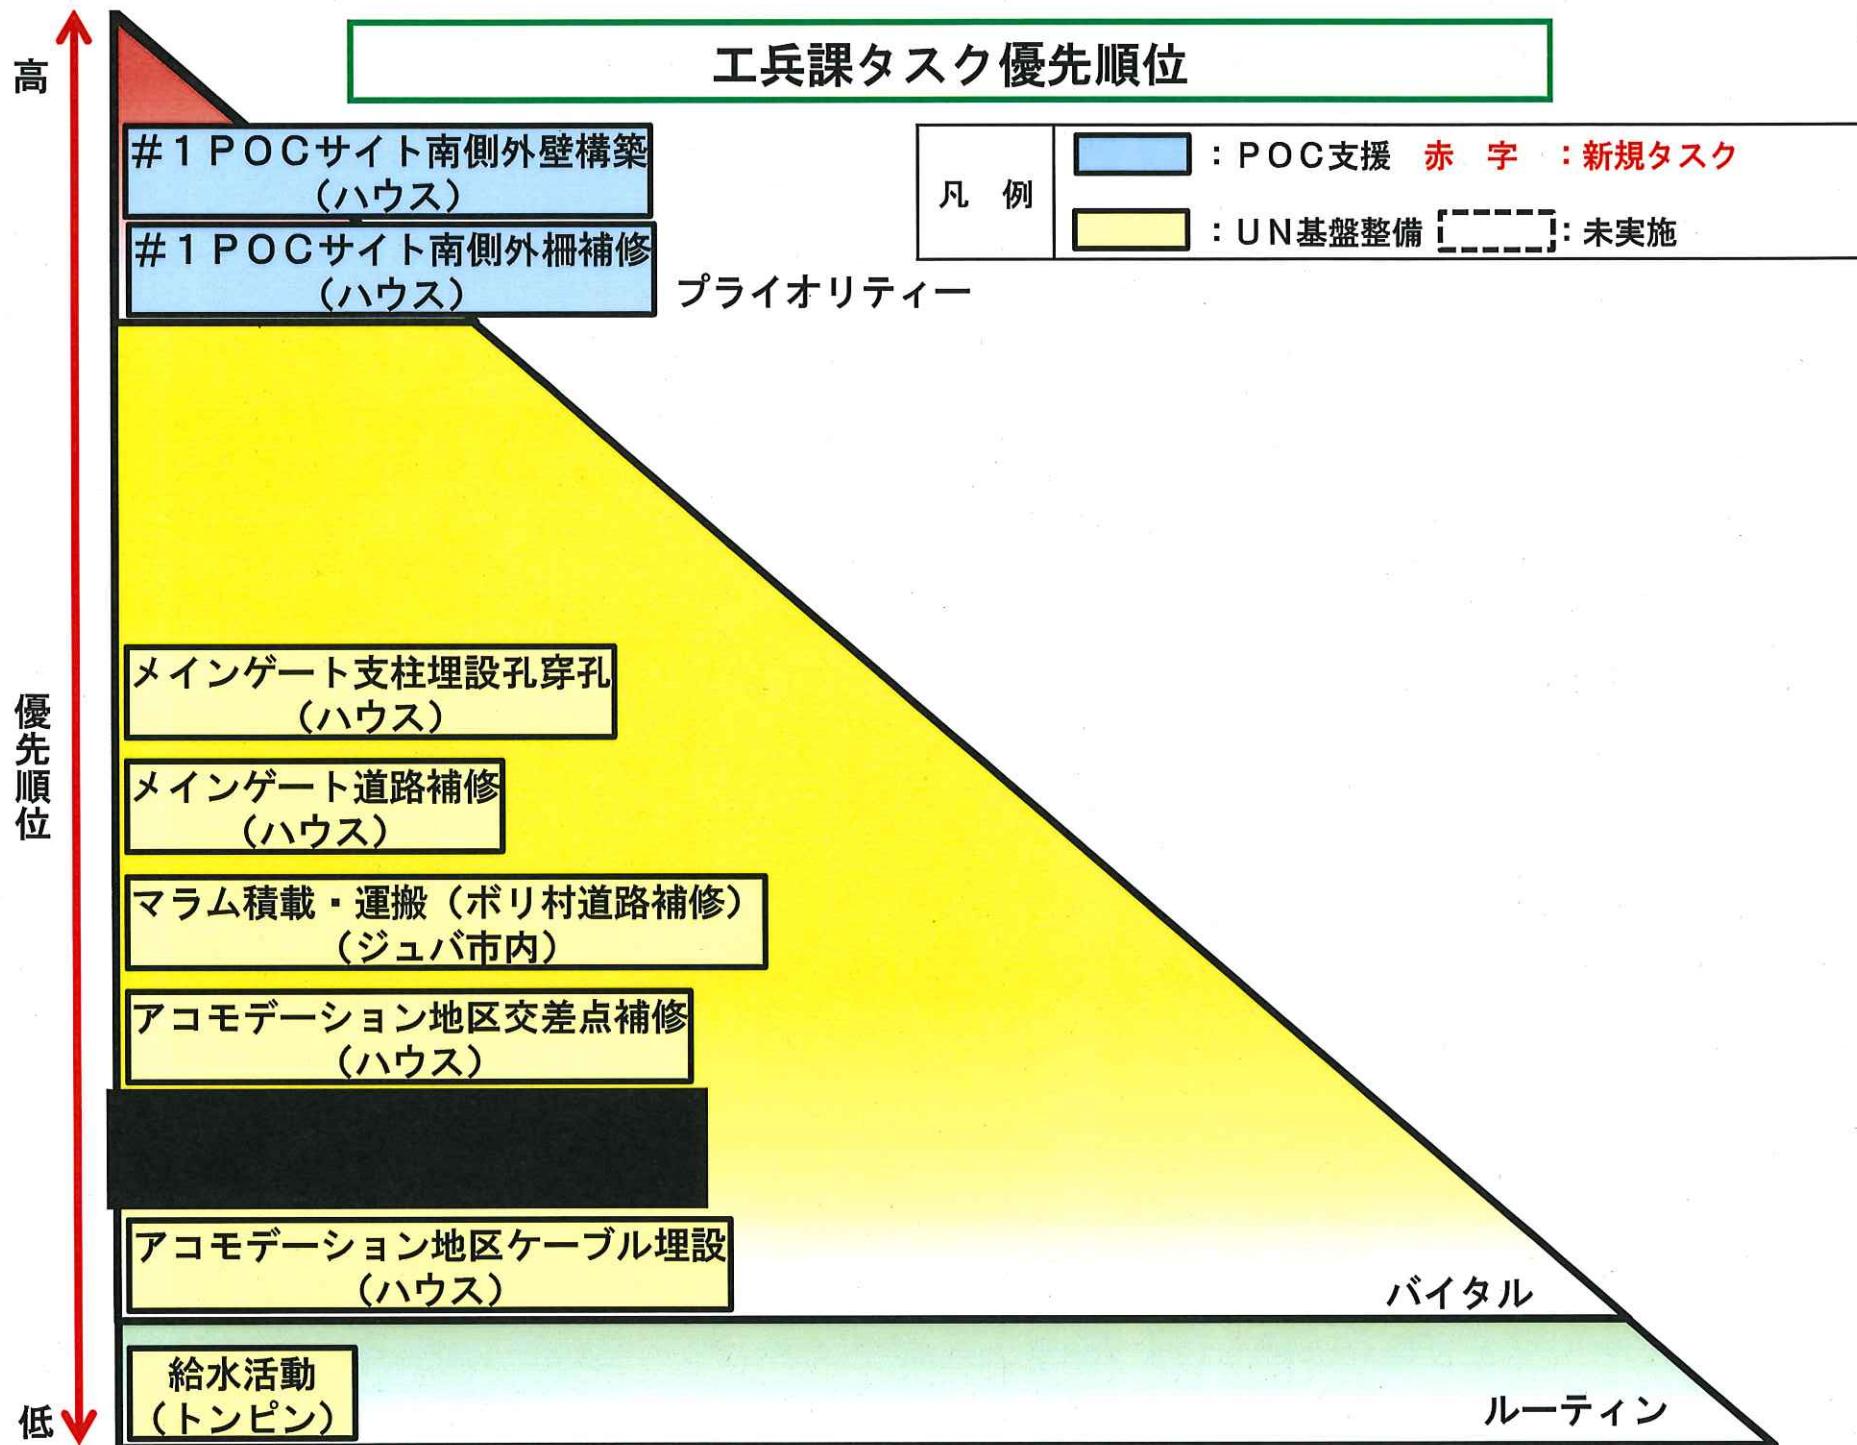

新規タスク一覧

新規タスク	
タスク名	オフィスロード道路補修（ハウス）
意義	UN職員及びハウス地区所在部隊の活動基盤の向上に寄与
目的	道路の補修・改善による車両通行の円滑化
内容	アスファルト道路の穴補修
区分・期間	バイタル・20日間

7月7日タスク等現況 (1/2)

凡 例 : POC支援 : UN基盤整備 : 完了タスク

1 実施中

タスクNo	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備考
391	POC支援	1	#1 POCサイト南側外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施計画				
443	POC支援	2	#1 POCサイト南側外柵補修	UNハウス	ヘスコ補修	実施計画				工兵課の指示待ち
397	UN基盤整備	3	メインゲート支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施計画				工兵課の指示待ち
398	UN基盤整備	4	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる道路補修	実施計画				
451	UN基盤整備	5	ログベース入口補修	UNトンピン	道路補修 ヘスコ設置	実施計画				
450	UN基盤整備	7	ウェストゲート暗渠増設	UNトンピン	暗渠設置 道路拡幅	実施計画				行程修正
351	UN基盤整備	6	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・運搬	実施累計 計画累計				工兵課の指示待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施計画				工兵課の指示待ち
447	UN基盤整備	7	アコモデーション地区交差点補修	UNハウス	交差点補修	実施計画				
333	UN基盤整備	8	アコモデーション地区ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝掘開・埋設	実施計画				工兵課の指示待ち
325	UN基盤整備	9	給水活動	UNトンピン	給水					

7月7日タスク等現況 (2/2)

凡 例	 	: UN基盤整備
-----	---	----------

2 未実施

タスク No	活動区分	優先 順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の 進捗状況	開始 時期	終了 時期	昼食の 形態	備 考
453	UN 基盤整備			UNハウス						

タスク累計受領数（完了数）		タスク実施数（第10次要員）	
		プライオリティー	3
		バイタル	27
		ルーティン	1
453 (443)		計	31
		完 了	21
		実施中	9
		未実施	1

警備の態勢

活動写真等



活動写真等

自隊計画



南スーダン建国5周年記念行事
サッカー 日本隊優勝

自隊計画




南スーダン建国5周年記念行事
サッカー 日本隊優勝

自隊計画



本部付隊（通信班）器材点検

自隊計画

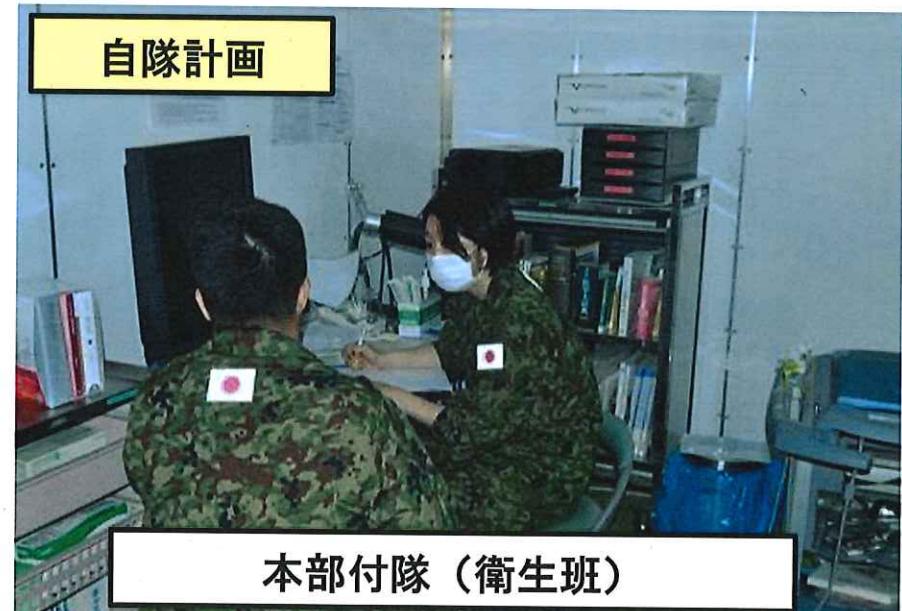

本部付隊（衛生班）
